

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
1		1	Criação de dashboard para gestão de recursos humanos e financeira no setor da Eletrônica Embarcada do SENAI CIMATEC	173,31 dias	Seg 04/04/22	Qui 01/12/22	
2		1.1	Detalhamento do cenário atual e as necessidades do cliente	49,01 dias	Seg 04/04/22	Sex 10/06/22	
3		1.1.1	Iniciação	9,11 dias	Seg 04/04/22	Sex 15/04/22	
4		1.1.1.1	Termo de confidencialidade	8,5 dias	Seg 04/04/22	Qui 14/04/22	
5		1.1.1.1.1	Elaborar o termo	5 dias	Seg 04/04/22	Sex 08/04/22	
6		1.1.1.1.2	Recolher as assinaturas de todos os envolvidos no projeto	3 dias	Seg 11/04/22	Qua 13/04/22	5
7		1.1.1.1.3	Anexar/salvar os documentos no Drive	0,5 dias	Qui 14/04/22	Qui 14/04/22	6
8		1.1.1.1.4	Início do projeto	0 dias	Seg 04/04/22	Seg 04/04/22	
9		1.1.1.2	Autorização do projeto	0,61 dias	Qui 14/04/22	Sex 15/04/22	4
10		1.1.1.2.1	Preencher o termo de autorização do projeto	0,5 dias	Qui 14/04/22	Qui 14/04/22	
11		1.1.1.2.2	Apresentar o termo de autorização para o cliente	0,1 dias	Sex 15/04/22	Sex 15/04/22	10
12		1.1.1.2.3	Assinar o termo de autorização por parte do cliente	0,01 dias	Sex 15/04/22	Sex 15/04/22	11
13		1.1.1.2.4	Projeto autorizado	0 dias	Sex 15/04/22	Sex 15/04/22	12
14		1.1.2	Planejamento	35,2 dias	Sex 15/04/22	Sex 03/06/22	3
15		1.1.2.1	Plano de Gerenciamento do Projeto	11,5 dias	Sex 15/04/22	Seg 02/05/22	
16		1.1.2.1.1	Elaborar Plano de Gerenciamento de Escopo	1 dia	Sex 15/04/22	Seg 18/04/22	

Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
17		1.1.2.1.2	Elaborar EAP	1,5 dias	Seg 18/04/22	Ter 19/04/22	16
18		1.1.2.1.3	Elaborar Plano de Gerenciamento de Tempo	1 dia	Ter 19/04/22	Qua 20/04/22	17
19		1.1.2.1.4	Elaborar Cronograma	2 dias	Ter 19/04/22	Qui 21/04/22	17
20		1.1.2.1.5	Elaborar Plano de Gerenciamento de Custo	1 dia	Ter 19/04/22	Qua 20/04/22	17
21		1.1.2.1.6	Elaborar Orçamento	0,2 dias	Qua 20/04/22	Qua 20/04/22	20
22		1.1.2.1.7	Elaborar Plano de Gerenciamento de Pessoas	0,3 dias	Qui 21/04/22	Qui 21/04/22	19
23		1.1.2.1.8	Elaborar Matriz de Responsabilidades	1 dia	Qua 20/04/22	Qui 21/04/22	21
24		1.1.2.1.9	Elaborar Plano de Gerenciamento de Comunicações e Partes Interessadas	0,5 dias	Qui 21/04/22	Sex 22/04/22	23
25		1.1.2.1.10	Elaborar Plano de Gerenciamento de Riscos	0,5 dias	Sex 22/04/22	Sex 22/04/22	24
26		1.1.2.1.11	Elaborar Plano de Resposta a Riscos	0,5 dias	Sex 22/04/22	Seg 25/04/22	25
27		1.1.2.1.12	Consolidar Plano de Gerenciamento de Projeto	0,3 dias	Seg 25/04/22	Seg 25/04/22	26
28		1.1.2.1.13	Buffer	5 dias	Seg 25/04/22	Seg 02/05/22	27
29		1.1.2.1.14	Plano de Projeto concluído	0 dias	Seg 02/05/22	Seg 02/05/22	28
30		1.1.2.2	Apresentação do plano do projeto	4,2 dias	Seg 02/05/22	Sex 06/05/22	15
31		1.1.2.2.1	Realizar uma apresentação explicando a metodologia do Theoprax	2 dias	Seg 02/05/22	Qua 04/05/22	
32		1.1.2.2.2	Realizar uma apresentação da necessidade do projeto no setor	1,5 dias	Qua 04/05/22	Sex 06/05/22	31
33		1.1.2.2.3	Realizar uma apresentação das limitações e riscos que a equipe enfrentar, na execução do projeto	0,7 dias	Sex 06/05/22	Sex 06/05/22	32

Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
34		1.1.2.3	Reunião com os líderes	3,5 dias	Sex 06/05/22	Qui 12/05/22	30
35		1.1.2.3.1	Marcar uma reunião de apresentação do projeto	1 dia	Sex 06/05/22	Seg 09/05/22	
36		1.1.2.3.2	Identificar as necessidades	1,2 dias	Seg 09/05/22	Qua 11/05/22	35
37		1.1.2.3.3	Identificar as nossas limitações	1,3 dias	Qua 11/05/22	Qui 12/05/22	36
38		1.1.2.4	Análise bruta dos dados e do cenário atual do setor	16 dias	Qui 12/05/22	Sex 03/06/22	34
39		1.1.2.4.1	Analisar os bancos de dados	8 dias	Qui 12/05/22	Ter 24/05/22	
40		1.1.2.4.2	Identificar a origem das fontes de dados	5 dias	Ter 24/05/22	Ter 31/05/22	39
41		1.1.2.4.3	Reunir a equipe para análise e discussão dos dados	3 dias	Ter 31/05/22	Sex 03/06/22	40
42		1.1.3	Controle	4,7 dias	Sex 03/06/22	Sex 10/06/22	14
43		1.1.3.1	Reuniões	2,5 dias	Sex 03/06/22	Ter 07/06/22	
44		1.1.3.1.1	Definir periodicidade para realização das reuniões	0,5 dias	Sex 03/06/22	Sex 03/06/22	
45		1.1.3.1.2	Alinhar com o cliente	1 dia	Sex 03/06/22	Seg 06/06/22	44
46		1.1.3.1.3	Agendar as datas no Google Calendário	1 dia	Seg 06/06/22	Ter 07/06/22	45
47		1.1.3.2	Ata de reunião	1,7 dias	Sex 03/06/22	Ter 07/06/22	
48		1.1.3.2.1	Elaborar um modelo de ata	0,5 dias	Sex 03/06/22	Sex 03/06/22	
49		1.1.3.2.2	Definir os responsável para elaboração das atas de cada reunião	1 dia	Sex 03/06/22	Seg 06/06/22	48
50		1.1.3.2.3	Enviar para assinatura dos presentes em cada reunião	0,2 dias	Seg 06/06/22	Ter 07/06/22	49
51		1.1.3.3	Visitas técnicas ao setor	3 dias	Ter 07/06/22	Sex 10/06/22	47
52		1.1.3.3.1	Definir as datas de visitas	1 dia	Ter 07/06/22	Qua 08/06/22	

Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
53		1.1.3.3.2	Alinhar com o cliente	1 dia	Qua 08/06/22	Qui 09/06/22	52
54		1.1.3.3.3	Definir os membros que estarão presentes em cada reunião	1 dia	Qui 09/06/22	Sex 10/06/22	53
55		1.1.4	Fase inicial concluída	0 dias	Sex 10/06/22	Sex 10/06/22	51
56		1.2	Construção das premissas para construção do Dashboard	61,8 dias	Sex 10/06/22	Seg 05/09/22	42
57		1.2.1	Estudo geral	23,5 dias	Sex 10/06/22	Qua 13/07/22	
58		1.2.1.1	Análise de viabilidade	5,5 dias	Sex 10/06/22	Sex 17/06/22	
59		1.2.1.1.1	Identificar as limitações da plataforma (Power BI)	3,5 dias	Sex 10/06/22	Qua 15/06/22	
60		1.2.1.1.2	Definir os responsáveis pela elaboração do Dashboard	0,5 dias	Qua 15/06/22	Qui 16/06/22	59
61		1.2.1.1.3	Definir a base técnica para a elaboração do Dashboard	1,5 dias	Qui 16/06/22	Sex 17/06/22	60
62		1.2.1.2	Levantamento das fontes de dados gerais	10 dias	Sex 17/06/22	Sex 01/07/22	58
63		1.2.1.2.1	Verificar se as fontes de dados são compatíveis com o Power BI	3 dias	Sex 17/06/22	Qua 22/06/22	
64		1.2.1.2.2	Definir um fluxo de dados para a comunicação com o Power BI	2 dias	Qua 22/06/22	Sex 24/06/22	63
65		1.2.1.2.3	Criar uma tabela centralizadora dos dados	5 dias	Sex 24/06/22	Sex 01/07/22	64
66		1.2.1.3	Levantamento das fontes de dados do financeiro	8 dias	Sex 01/07/22	Qua 13/07/22	62
67		1.2.1.3.1	Identificar a origem dos dados	1 dia	Sex 01/07/22	Seg 04/07/22	
68		1.2.1.3.2	Verificar se as fontes de dados são compatíveis com o Power BI	1,2 dias	Seg 04/07/22	Ter 05/07/22	67
69		1.2.1.3.3	Definir um fluxo de dados para a comunicação com o Power BI	1,8 dias	Ter 05/07/22	Qui 07/07/22	68
70		1.2.1.3.4	Criar uma tabela centralizadora dos dados	4 dias	Qui 07/07/22	Qua 13/07/22	69

Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
71		1.2.2	Levantamento de dados	16,5 dias	Qua 13/07/22	Sex 05/08/22	57
72		1.2.2.1	Descrição dos bancos de dados	3 dias	Qua 13/07/22	Seg 18/07/22	
73		1.2.2.1.1	Identificar o modelo dos bancos de dados	1 dia	Qua 13/07/22	Qui 14/07/22	
74		1.2.2.1.2	Identificar o responsável pela atualização dos dados	1 dia	Qui 14/07/22	Sex 15/07/22	73
75		1.2.2.1.3	Fazer a atualização dos dados	1 dia	Sex 15/07/22	Seg 18/07/22	74
76		1.2.2.2	Verificação do formato de cada banco	3 dias	Seg 18/07/22	Qui 21/07/22	72
77		1.2.2.2.1	Identificar o formato de cada banco	0,8 dias	Seg 18/07/22	Ter 19/07/22	
78		1.2.2.2.2	Fazer uma planilha com as verificações do formato de cada banco	1,3 dias	Ter 19/07/22	Qua 20/07/22	77
79		1.2.2.2.3	Adequar os formatos, se necessário	0,9 dias	Qua 20/07/22	Qui 21/07/22	78
80		1.2.2.3	Verificação do local de armazenamento	4 dias	Qui 21/07/22	Qua 27/07/22	76
81		1.2.2.3.1	Mapear onde estão armazenados esses bancos de dados	1,4 dias	Qui 21/07/22	Sex 22/07/22	
82		1.2.2.3.2	Definir locais para armazenamento dos recortes (views) fornecidos dos bancos de dados	1,6 dias	Sex 22/07/22	Ter 26/07/22	81
83		1.2.2.3.3	Alinhar com o cliente	0,4 dias	Ter 26/07/22	Ter 26/07/22	82
84		1.2.2.3.4	Reunir com a equipe do TI	0,6 dias	Ter 26/07/22	Qua 27/07/22	83
85		1.2.2.4	Identificação do responsável pela alimentação dos bancos de dados	3 dias	Qua 27/07/22	Seg 01/08/22	80
86		1.2.2.4.1	Mapear quem alimenta cada banco de dados	1,5 dias	Qua 27/07/22	Sex 29/07/22	
87		1.2.2.4.2	Realizar reuniões com a equipe responsável pela alimentação dos bancos de dados	0,8 dias	Sex 29/07/22	Sex 29/07/22	86
88		1.2.2.4.3	Identificar a periodicidade das atualizações	0,7 dias	Sex 29/07/22	Seg 01/08/22	87

Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
89		1.2.2.5	Levantamento dos principais dados gerados por cada banco	3,5 dias	Seg 01/08/22	Sex 05/08/22	85
90		1.2.2.5.1	Identificar quais dados são fornecidos por cada banco	2 dias	Seg 01/08/22	Qua 03/08/22	
91		1.2.2.5.2	Identificar quais informações tais dados podem gerar	1 dia	Qua 03/08/22	Qui 04/08/22	90
92		1.2.2.5.3	Alinhar com o cliente as principais informações devem ser tratadas e analisadas	0,5 dias	Qui 04/08/22	Sex 05/08/22	91
93		1.2.3	Levantamento técnico	21,8 dias	Sex 05/08/22	Seg 05/09/22	71
94		1.2.3.1	Identificação dos indicadores mais pertinentes para tomadas de decisões	1,3 dias	Sex 05/08/22	Seg 08/08/22	
95		1.2.3.1.1	Definir, junto ao cliente, quais informações são relevantes nas tomadas de decisões do setor	0,1 dias	Sex 05/08/22	Sex 05/08/22	
96		1.2.3.1.2	Definir, junto ao cliente, quais indicadores gerarão tais informações	0,2 dias	Sex 05/08/22	Sex 05/08/22	95
97		1.2.3.1.3	Estudar como esse indicador será mostrado (c/ gráficos, tabelas...)	1 dia	Sex 05/08/22	Seg 08/08/22	96
98		1.2.3.2	Estruturação dos dados para gerar as informações desejadas	9,5 dias	Seg 08/08/22	Sex 19/08/22	94
99		1.2.3.2.1	Estudar quais relações precisam ser criadas nos bancos de dados para gerar as informações desejadas	2 dias	Seg 08/08/22	Qua 10/08/22	
100		1.2.3.2.2	Ver compatibilidade dos bancos de dados	3 dias	Qua 10/08/22	Seg 15/08/22	99
101		1.2.3.2.3	Estruturar no Power BI	4,5 dias	Seg 15/08/22	Sex 19/08/22	100
102		1.2.3.3	Organização da validação dos dados	11 dias	Sex 19/08/22	Seg 05/09/22	98
103		1.2.3.3.1	Identificar vulnerabilidades da atual tabela centralizada	3 dias	Sex 19/08/22	Qua 24/08/22	













Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			




















Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
104		1.2.3.3.2	Reestruturar atual tabela centralizadora para validação de dados	4 dias	Qua 24/08/22	Ter 30/08/22	103
105		1.2.3.3.3	Organizar validação de dados	4 dias	Ter 30/08/22	Seg 05/09/22	104
106		1.2.3.3.4	Fase de estudos e levantamento de dados concluída	0 dias	Seg 05/09/22	Seg 05/09/22	105
107		1.3	Execução do projeto e testes de validação	62,5 dias	Seg 05/09/22	Qui 01/12/22	56
108		1.3.1	Automatização da atualização de dados	23 dias	Seg 05/09/22	Qui 06/10/22	
109		1.3.1.1	Estudar meios de automatizar a atualização de dados	15 dias	Seg 05/09/22	Seg 26/09/22	
110		1.3.1.2	Realizar testes das automatizações das atualizações de dados	5 dias	Seg 26/09/22	Seg 03/10/22	109
111		1.3.1.3	Eliminar os erros gerados na fase de testes	3 dias	Seg 03/10/22	Qui 06/10/22	110
112		1.3.1.4	Atualização de dados automatizada	0 dias	Qui 06/10/22	Qui 06/10/22	111
113		1.3.2	Integração do Clockify	8 dias	Qui 06/10/22	Ter 18/10/22	108
114		1.3.2.1	Reestruturar o Clockify	3 dias	Qui 06/10/22	Ter 11/10/22	
115		1.3.2.2	Atualizar as informações no clockify	4 dias	Ter 11/10/22	Seg 17/10/22	114
116		1.3.2.3	Realizar testes de uso da plataforma	1 dia	Seg 17/10/22	Ter 18/10/22	115
117		1.3.3	Testes de atualização de dados	8 dias	Ter 18/10/22	Sex 28/10/22	113
118		1.3.3.1	Testar o funcionamento da atualização de dados	4 dias	Ter 18/10/22	Seg 24/10/22	
119		1.3.3.2	Validar os erros indetificados ou pontos de melhoria	3 dias	Seg 24/10/22	Qui 27/10/22	118
120		1.3.3.3	Testar novamente com as melhorias aplicadas	1 dia	Qui 27/10/22	Sex 28/10/22	119
121		1.3.4	Verificação do Clockify	5 dias	Sex 28/10/22	Sex 04/11/22	117
122		1.3.4.1	Verificar como o pessoal utiliza o Clockify	2 dias	Sex 28/10/22	Ter 01/11/22	
123		1.3.4.2	Identificar frequência com que o pessoal utiliza o Clockify	1 dia	Ter 01/11/22	Qua 02/11/22	122


Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras
124		1.3.4.3	Identificar erros ou problemas no cadastramento do pessoal ou das áreas	2 dias	Qua 02/11/22	Sex 04/11/22	123
125		1.3.5	Validação dos dashboards criados e integrações feitas	7,5 dias	Sex 04/11/22	Qua 16/11/22	121
126		1.3.5.1	Checar se dashboards mostram as informações corretas	3 dias	Sex 04/11/22	Qua 09/11/22	
127		1.3.5.2	Identificar vulnerabilidades	2 dias	Qua 09/11/22	Sex 11/11/22	126
128		1.3.5.3	Corrigir erros	2,5 dias	Sex 11/11/22	Qua 16/11/22	127
129		1.3.5.4	Dashboard concluído e testado	0 dias	Qua 16/11/22	Qua 16/11/22	128
130		1.3.6	Criação do Manual de Utilização e Manutenção das planilhas, dashboards e clockify	11 dias	Qua 16/11/22	Qui 01/12/22	125
131		1.3.6.1	Definir sumário do manual	1 dia	Qua 16/11/22	Qui 17/11/22	
132		1.3.6.2	Ordenar os itens por relevância ou criar uma estratégia que facilite a leitura	2 dias	Qui 17/11/22	Seg 21/11/22	131
133		1.3.6.3	Elaborar manual	7 dias	Seg 21/11/22	Qua 30/11/22	132
134		1.3.6.4	Definir local em que ele será armazenado e disponibilizado	1 dia	Qua 30/11/22	Qui 01/12/22	133
135		1.3.6.5	Projeto concluído	0 dias	Qui 01/12/22	Qui 01/12/22	134

Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

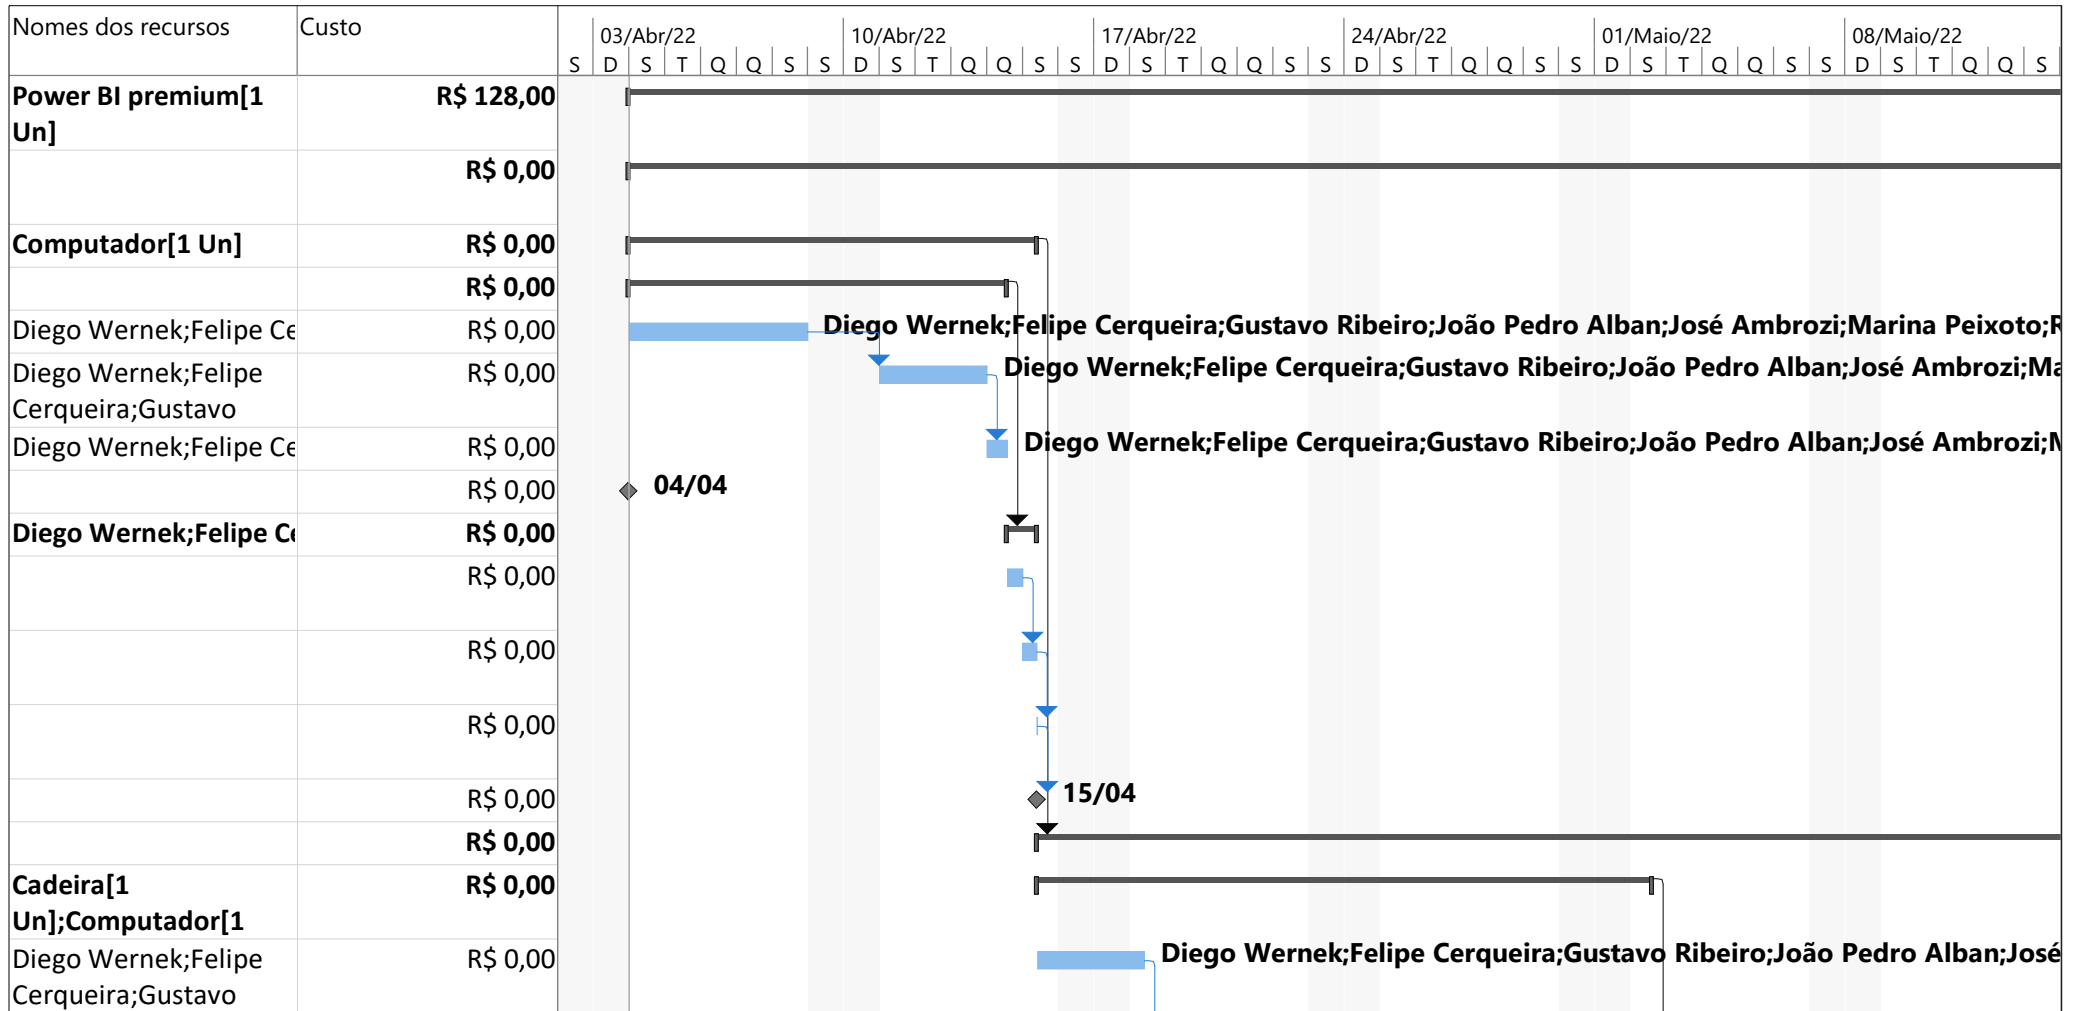

Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Nomes dos recursos	Custo	03/Abr/22		10/Abr/22		17/Abr/22		24/Abr/22		01/Maio/22		08/Maio/22												
		S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	
Cadeira[1 Un];Computa	R\$ 0,00																							
José Ambrozi	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira;José Al	R\$ 0,00																							
Diego Wernek;Felipe Ce	R\$ 0,00																							
Cadeira[1 Un];Computa	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira;José Al	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira;Marina	R\$ 0,00																							
Diego Wernek;Felipe Ce	R\$ 0,00																							
Computador[1 Un];Exc	R\$ 0,00																							
	R\$ 0,00																							
Rodrigo Eliotério	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira	R\$ 0,00																							
João Pedro Alban	R\$ 0,00																							
	R\$ 0,00																							
Gustavo Ribeiro	R\$ 0,00																							
Gustavo Ribeiro	R\$ 0,00																							
Gustavo Ribeiro	R\$ 0,00																							
	R\$ 0,00																							
Diego Wernek	R\$ 0,00																							






















Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Nomes dos recursos	Custo	03/Abr/22		10/Abr/22		17/Abr/22		24/Abr/22		01/Maio/22		08/Maio/22												
		S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	
Cadeira[1 Un];Computa	R\$ 0,00																							
	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira;José A	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira;José A	R\$ 0,00																							
	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira;Marina	R\$ 0,00																							
Gustavo Ribeiro;João	R\$ 0,00																							
Pedro Alban;José																								
Diego Wernek;Felipe Ce	R\$ 0,00																							
	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira;José A	R\$ 0,00																							
Diego Wernek;Felipe	R\$ 0,00																							
Cerqueira;Marina																								
Felipe Cerqueira;José A	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira;Marina	R\$ 0,00																							
	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira;José	R\$ 0,00																							
Ambrozi;Marina																								
Felipe Cerqueira;José A	R\$ 0,00																							

Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Nomes dos recursos	Custo	03/Abr/22		10/Abr/22		17/Abr/22		24/Abr/22		01/Maio/22		08/Maio/22												
		S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	
Diego Wernek;Felipe Cerqueira;Marina	R\$ 0,00																							
Cadeira[1 Un];Computador[1 Un]	R\$ 0,00																							
Felipe Cerqueira;Gustavo	R\$ 0,00																							
Gustavo Ribeiro;Rodrigo	R\$ 0,00																							
Rodrigo Eliotério;Gustavo	R\$ 0,00																							
	R\$ 0,00																							
Cadeira[1 Un];Computador[1 Un]	R\$ 0,00																							
Gustavo Ribeiro;João Pedro	R\$ 0,00																							
Diego Wernek;Gustavo Ribeiro;Rodrigo	R\$ 0,00																							
Gustavo Ribeiro;João Pedro	R\$ 0,00																							
Gustavo Ribeiro;João Pedro Alban;José	R\$ 0,00																							
	R\$ 0,00																							

Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

15/Maio/22 22/Maio/22 29/Maio/22 05/Jun/22 12/Jun/22 19/Jun/22 26/Jun/22 03/Jul/22

S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S




















Rodrigo Eliotério


Marina Peixoto;Rodrigo Eliotério

Marina Peixoto;Rodrigo Eliotério



é Ambrozi;Marina Peixoto;Rodrigo Eliotério

Projeto: Cronograma-Theoprax
Data: Seg 23/05/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

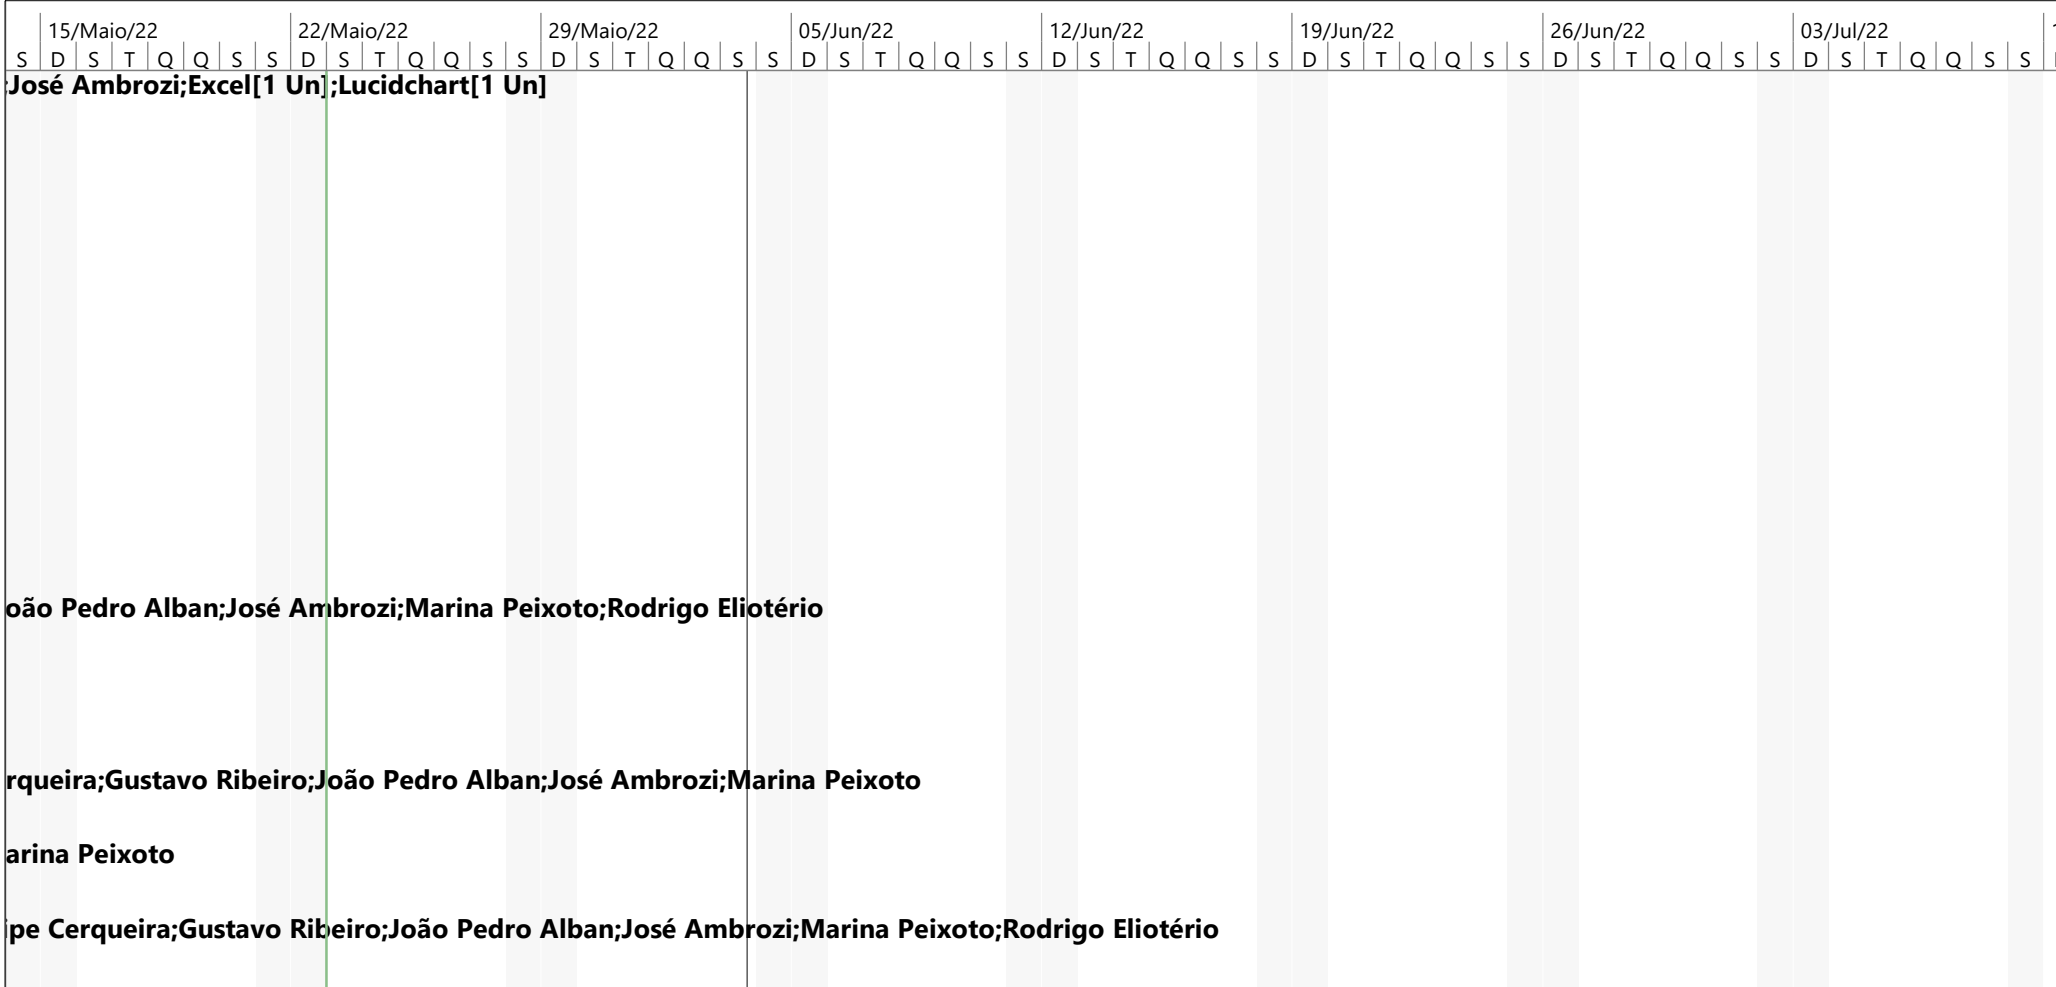


Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

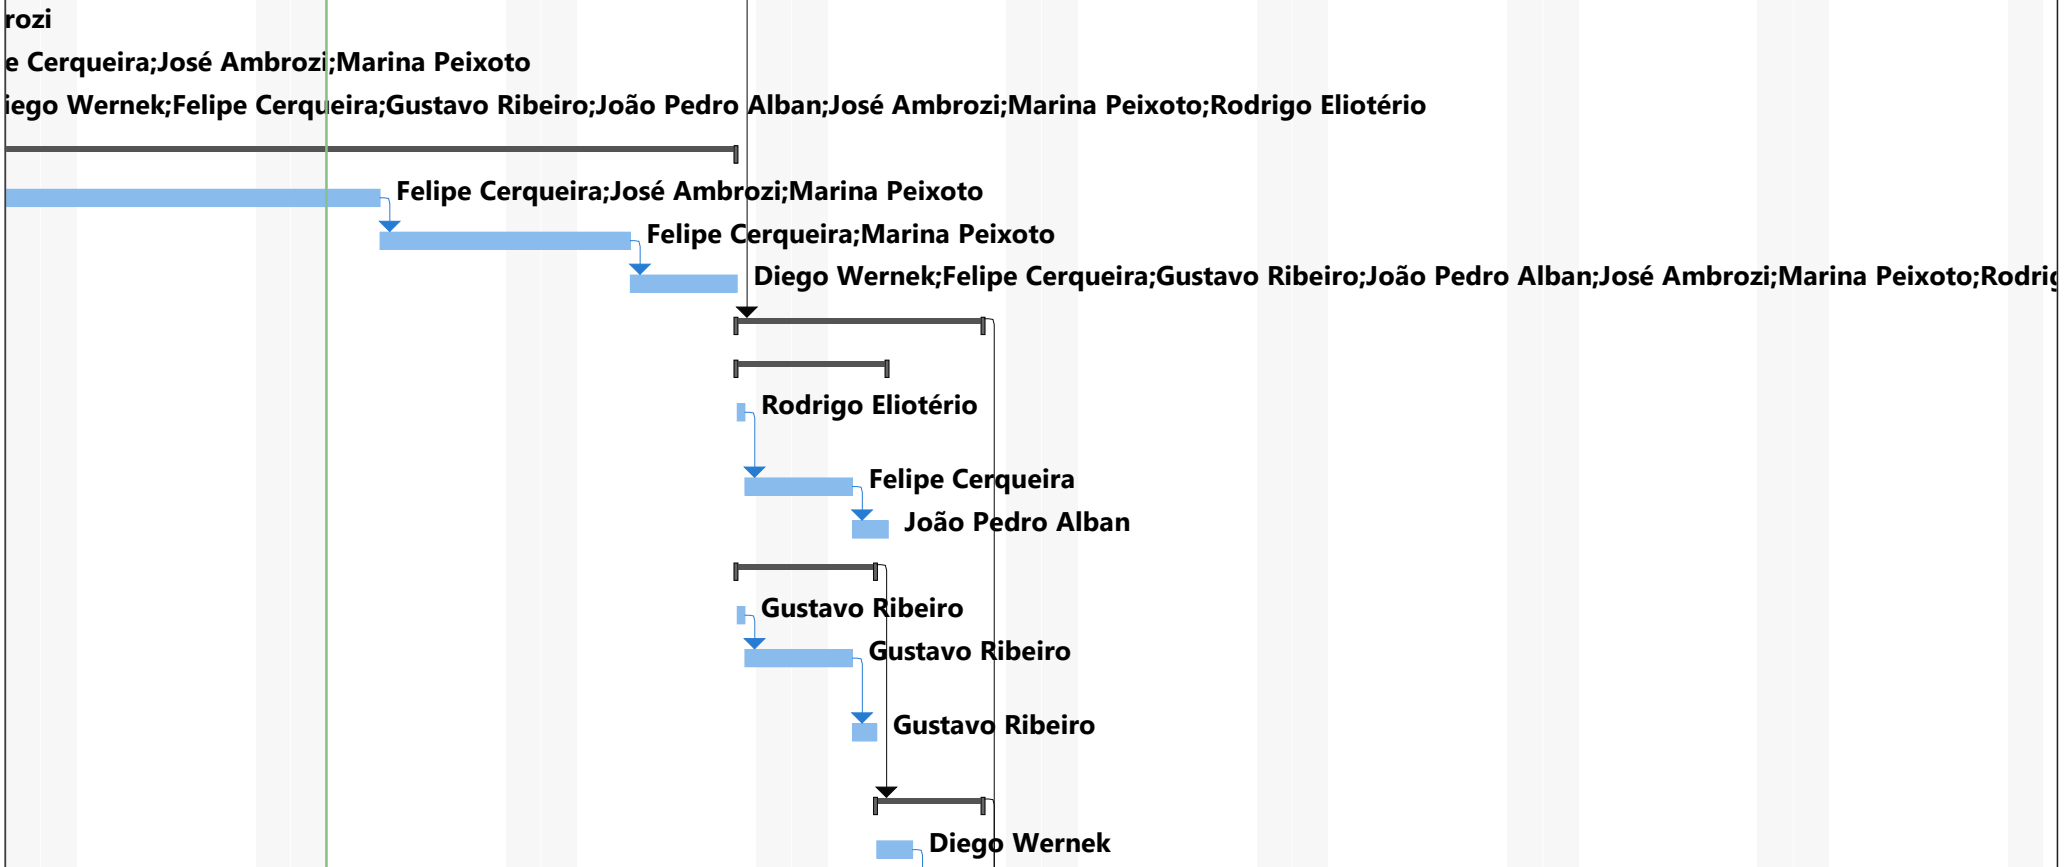

Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

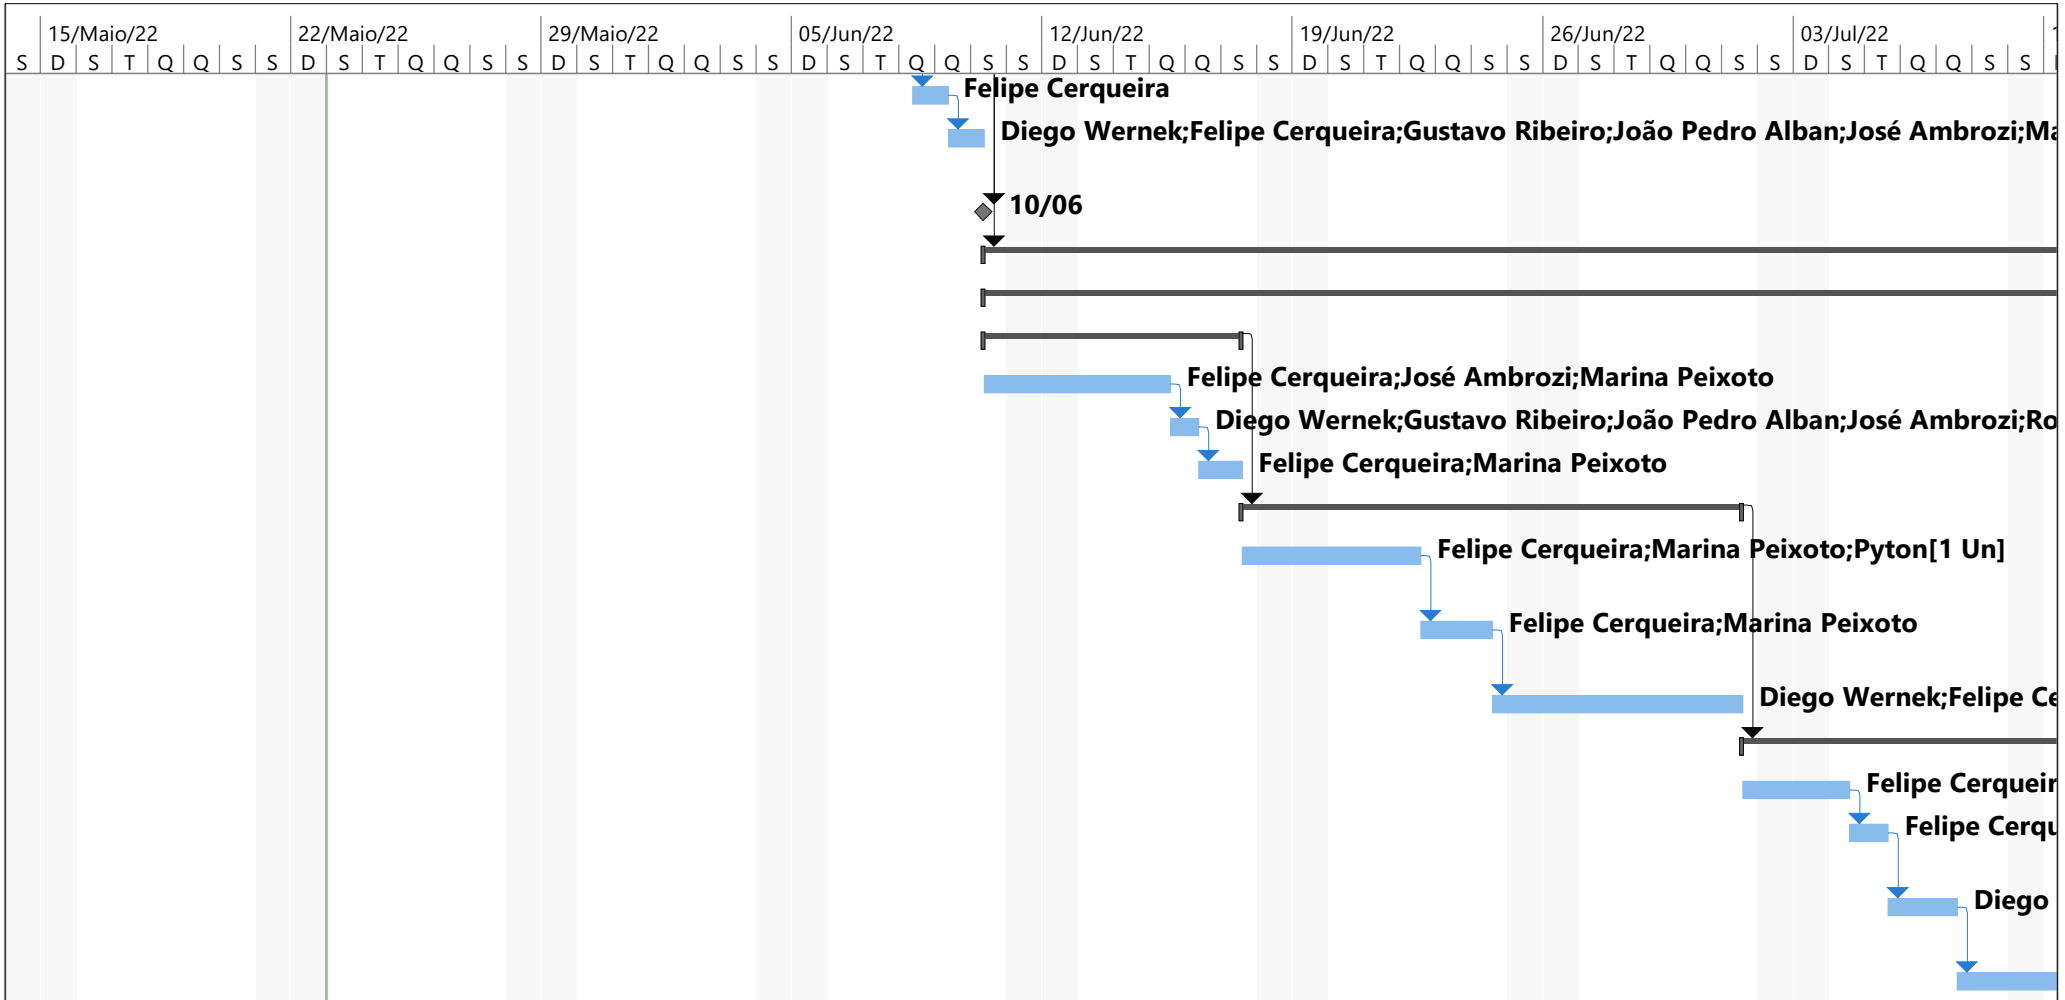


Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

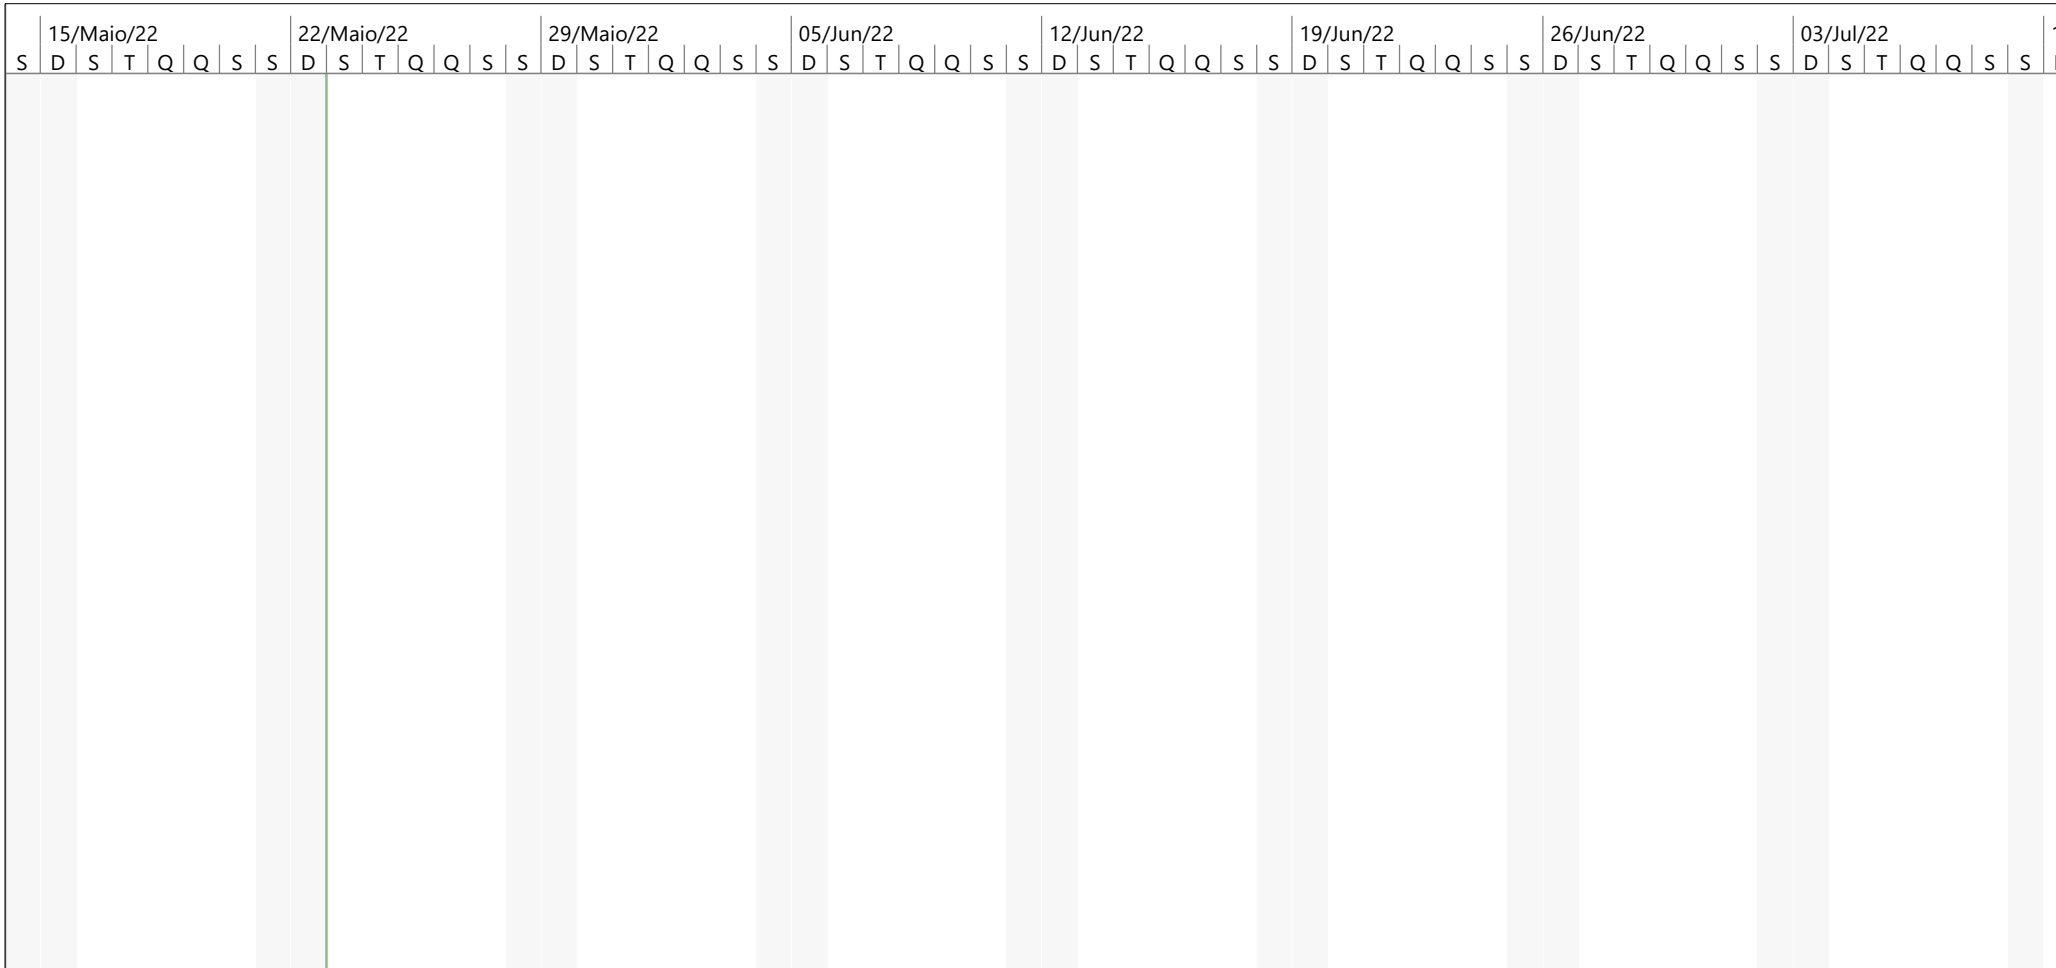


Projeto: Cronograma-Theoprax
 Data: Seg 23/05/22



Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			



Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

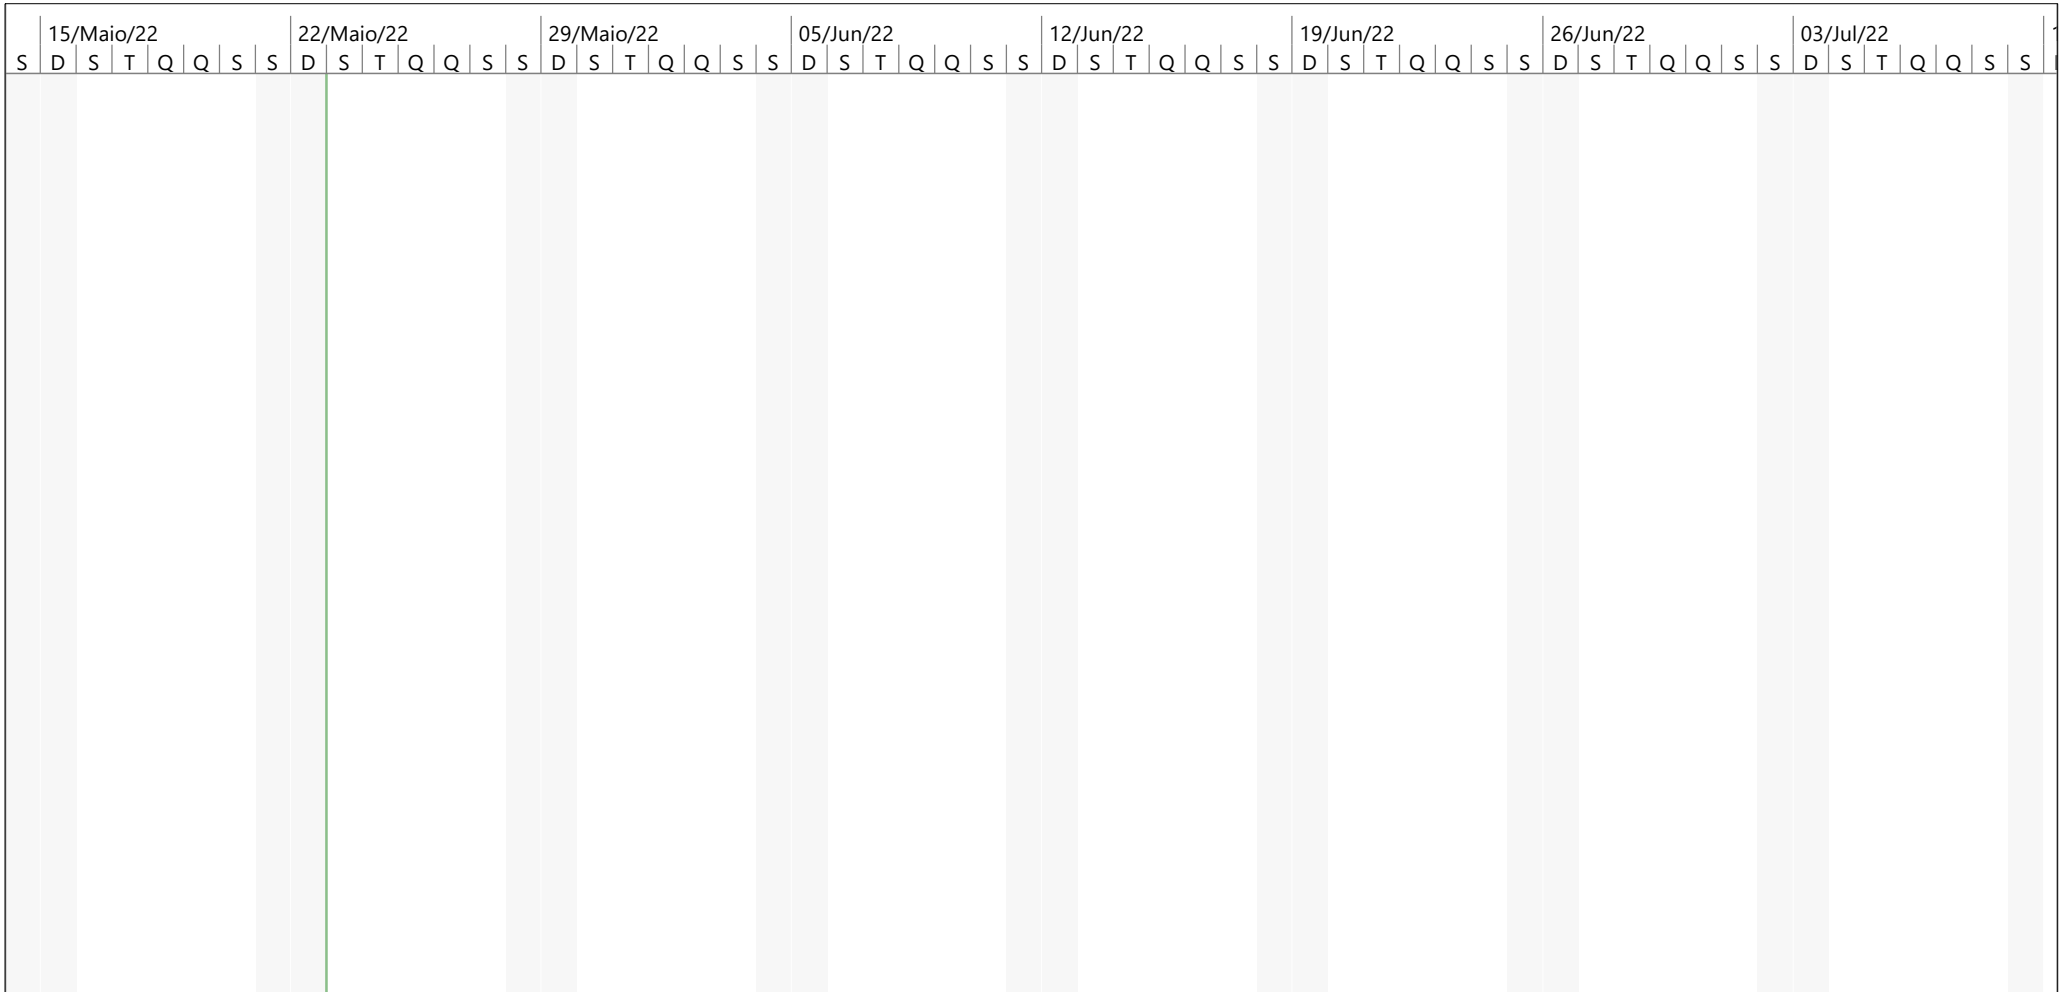


Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

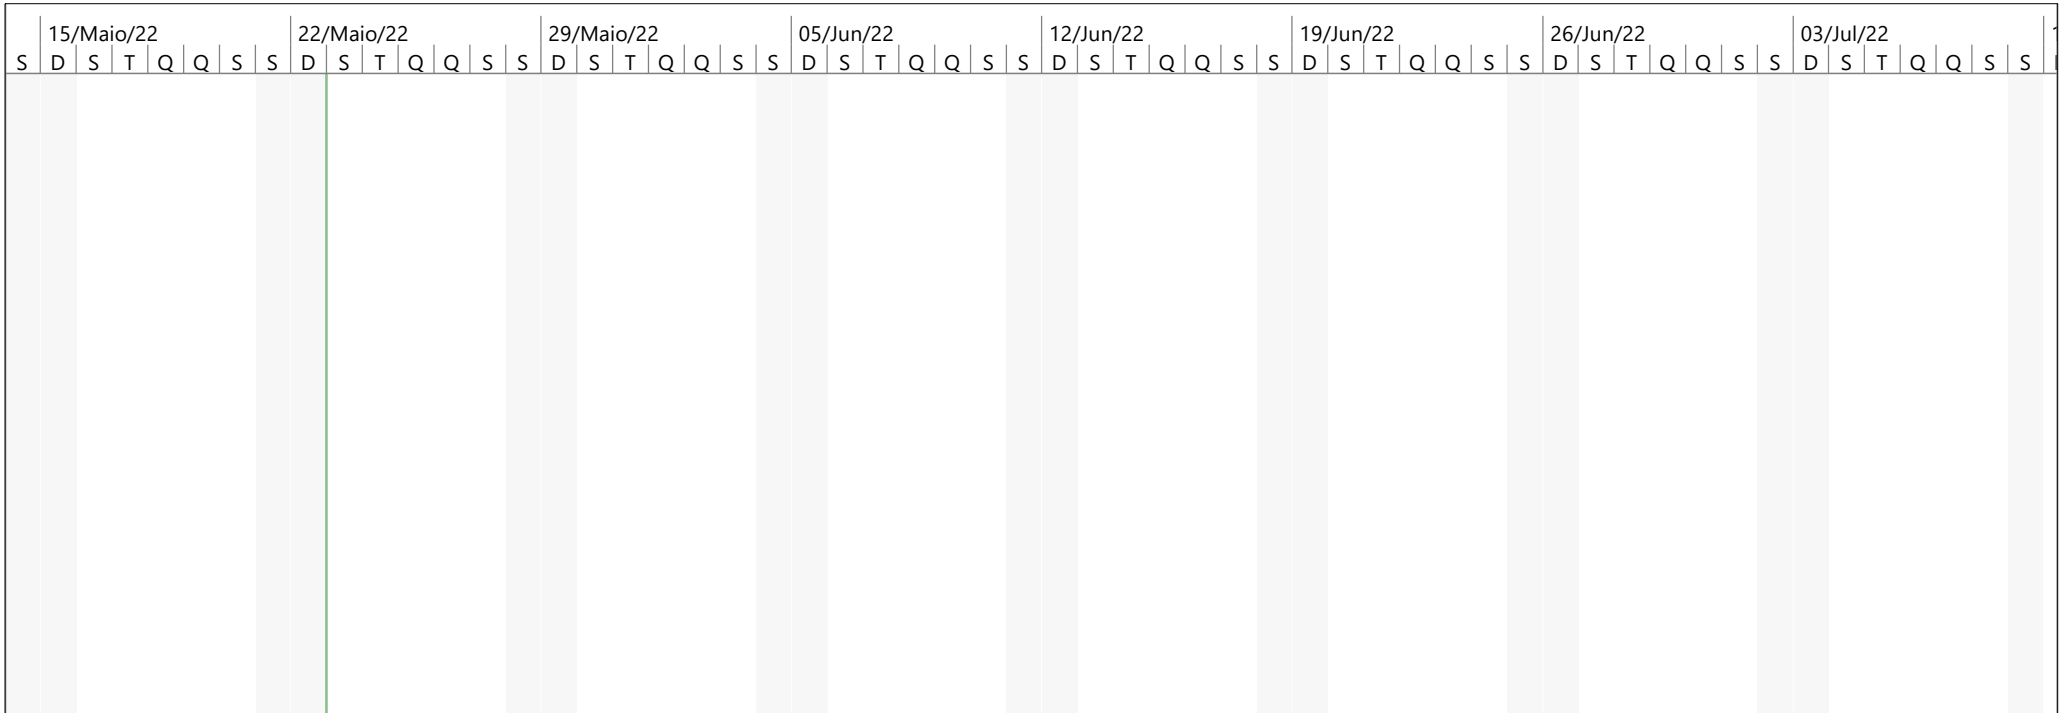

Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

10/Jul/22 17/Jul/22 24/Jul/22 31/Jul/22 07/Ago/22 14/Ago/22 21/Ago/22 28/Ago/22 04/S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

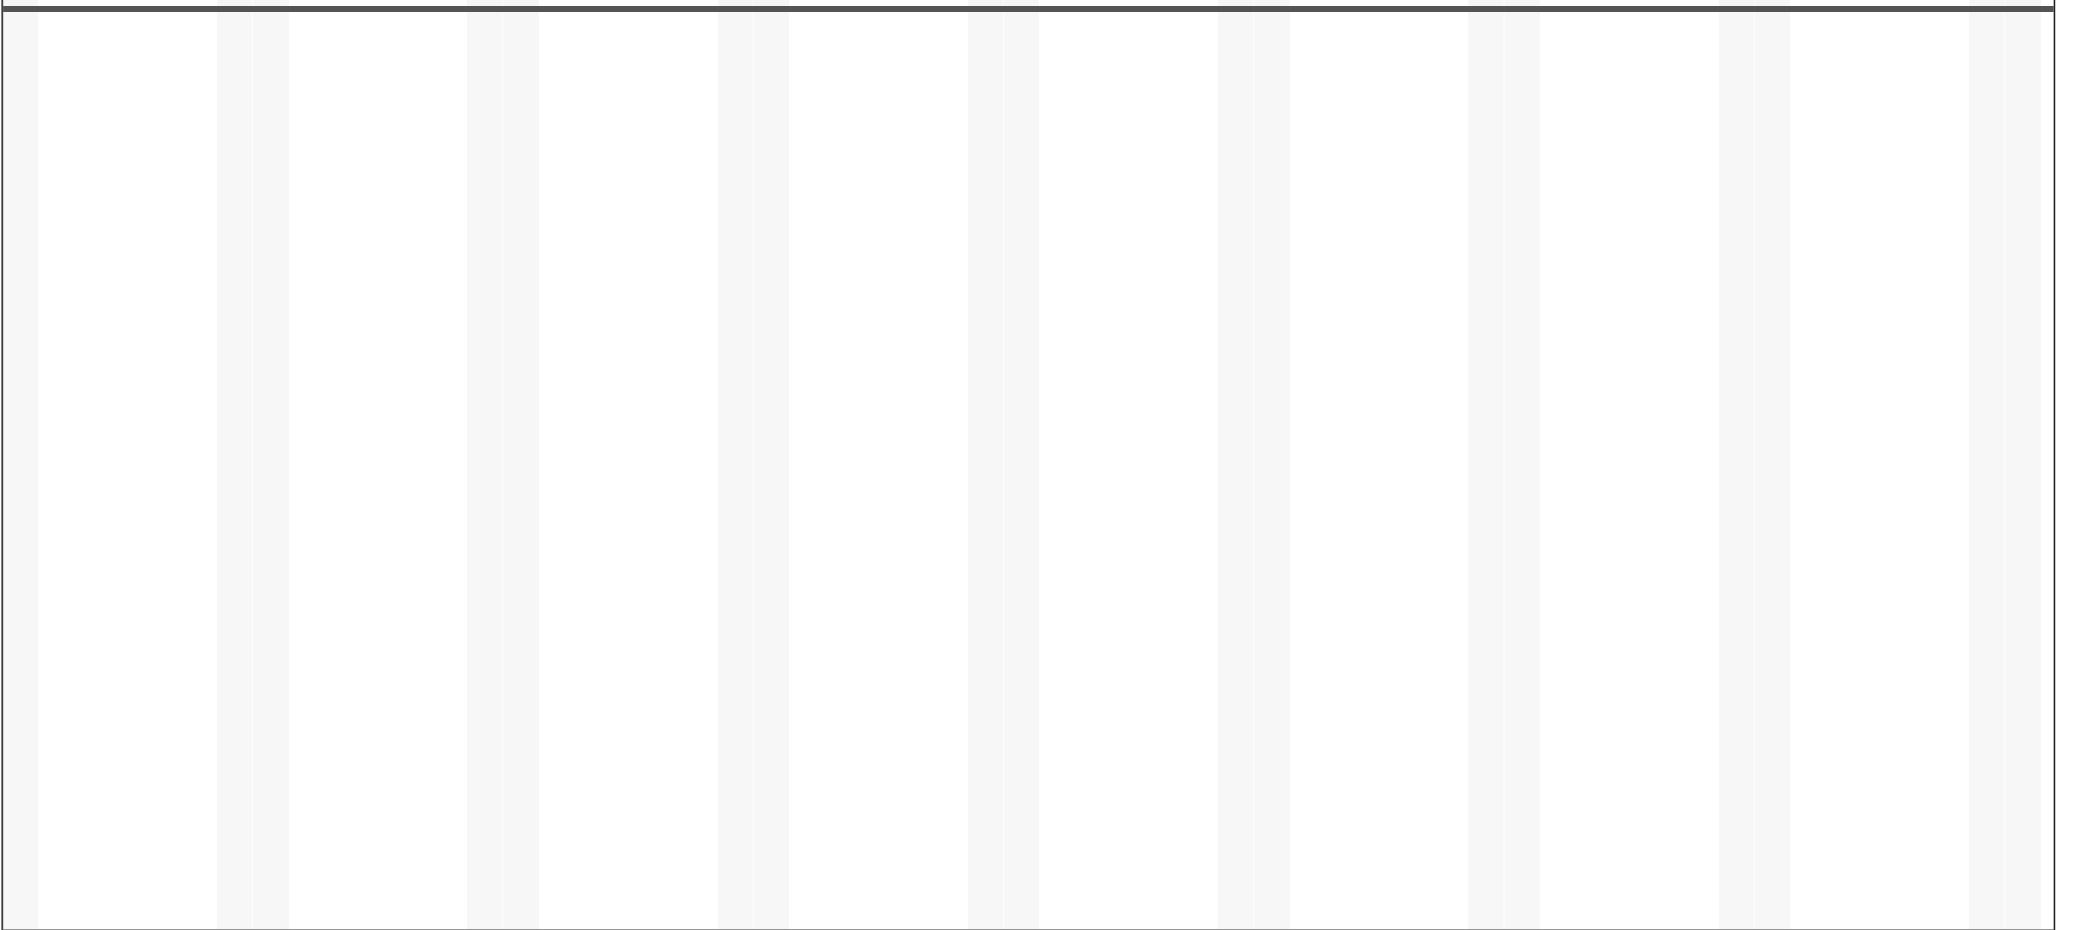

Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

10/Jul/22 17/Jul/22 24/Jul/22 31/Jul/22 07/Ago/22 14/Ago/22 21/Ago/22 28/Ago/22 04/S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

origo Eliotério

Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

10/Jul/22 17/Jul/22 24/Jul/22 31/Jul/22 07/Ago/22 14/Ago/22 21/Ago/22 28/Ago/22 04/S

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

Marina Peixoto;Rodrigo Eliotério

Rodrigo Eliotério

Cerqueira;Gustavo Ribeiro;João Pedro Alban;José Ambrozi;Marina Peixoto;Rodrigo Eliotério


eira;Marina Peixoto

queira;José Ambrozi;Excel[1 Un]


o Wernek;Felipe Cerqueira;Gustavo Ribeiro;João Pedro Alban;José Ambrozi;Marina Peixoto;Rodrigo Eliotério

Diego Wernek;Felipe Cerqueira;João Pedro Alban;José Ambrozi



Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

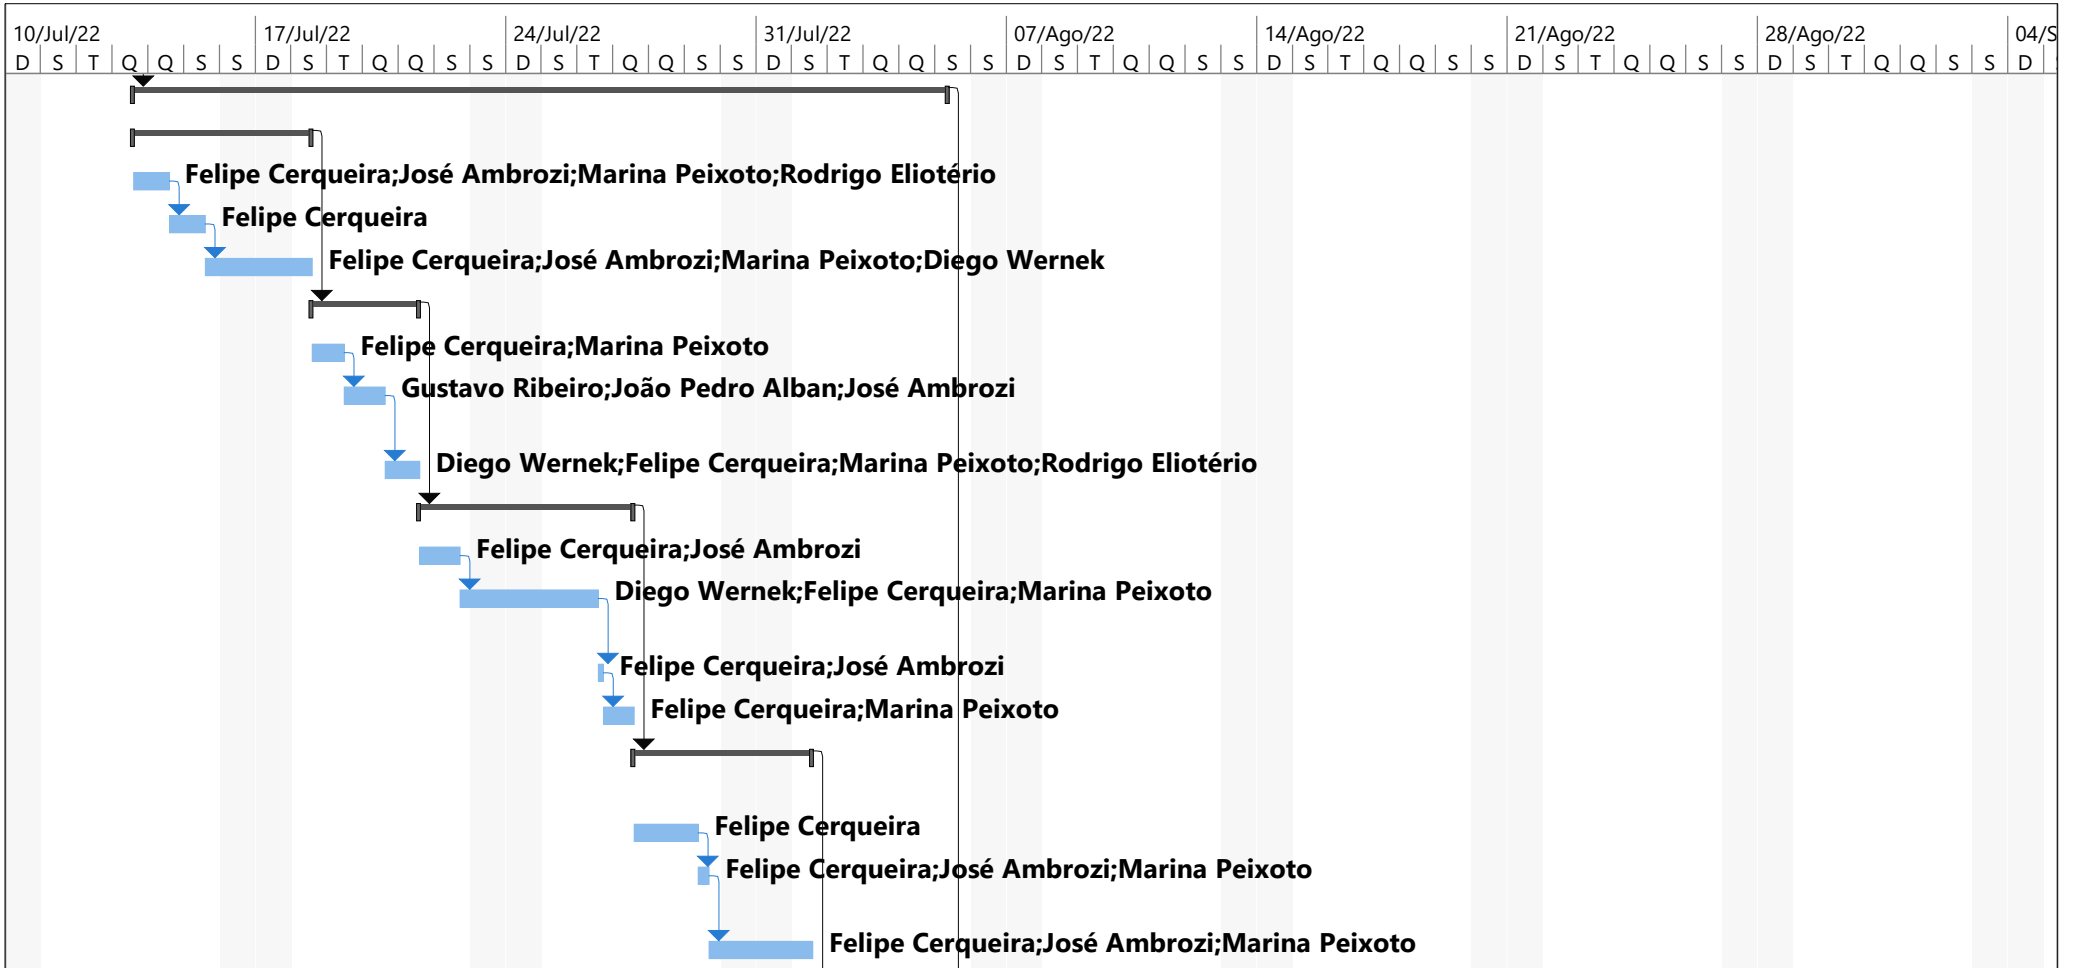

Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

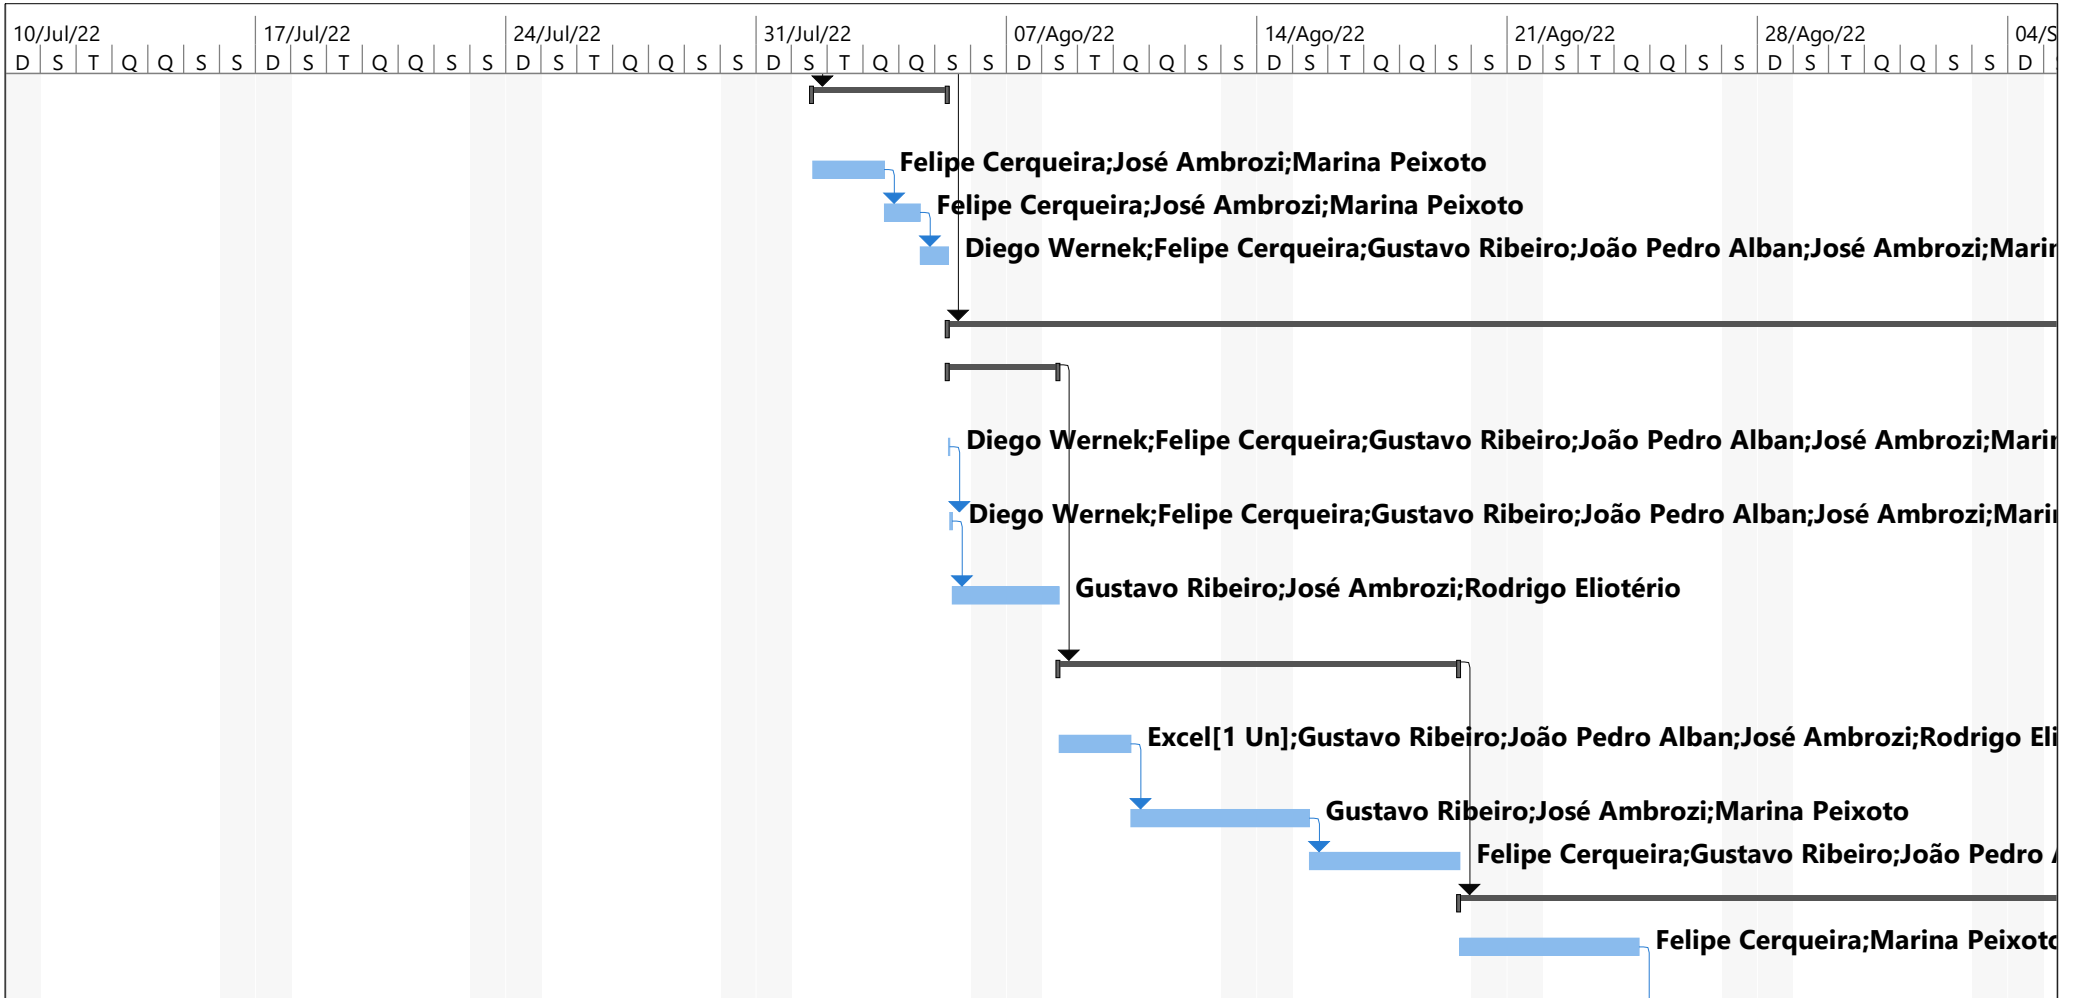


Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

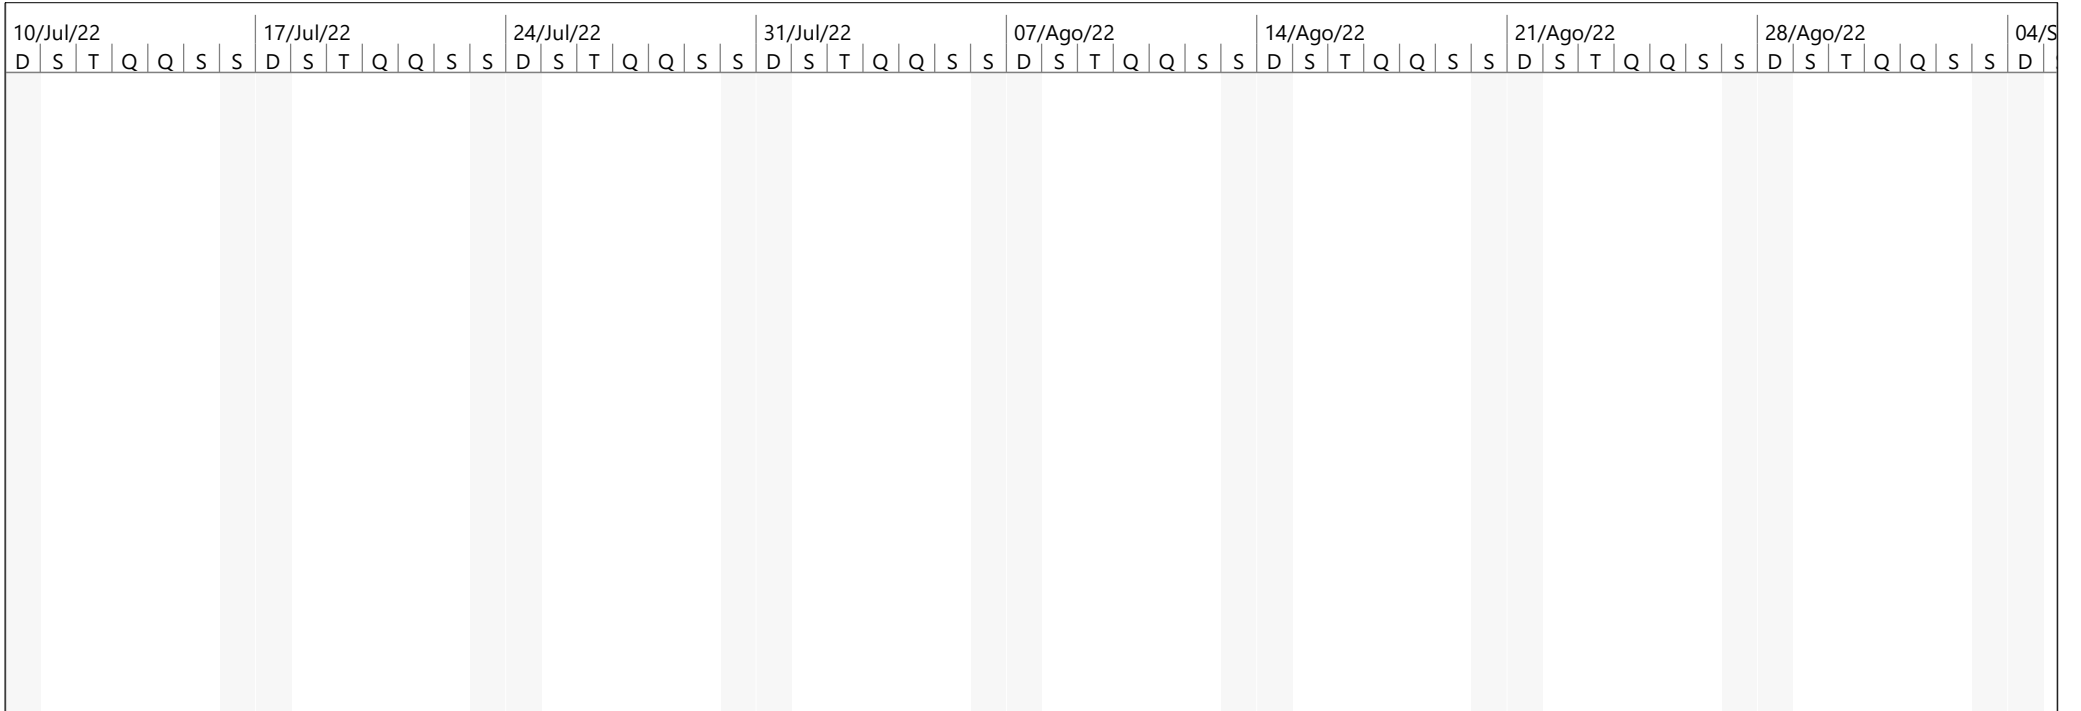


Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Set/22 | 11/Set/22 | 18/Set/22 | 25/Set/22 | 02/Out/22 | 09/Out/22 | 16/Out/22 | 23/Out/22 | 30/Out/


 S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S T Q Q S S | D S

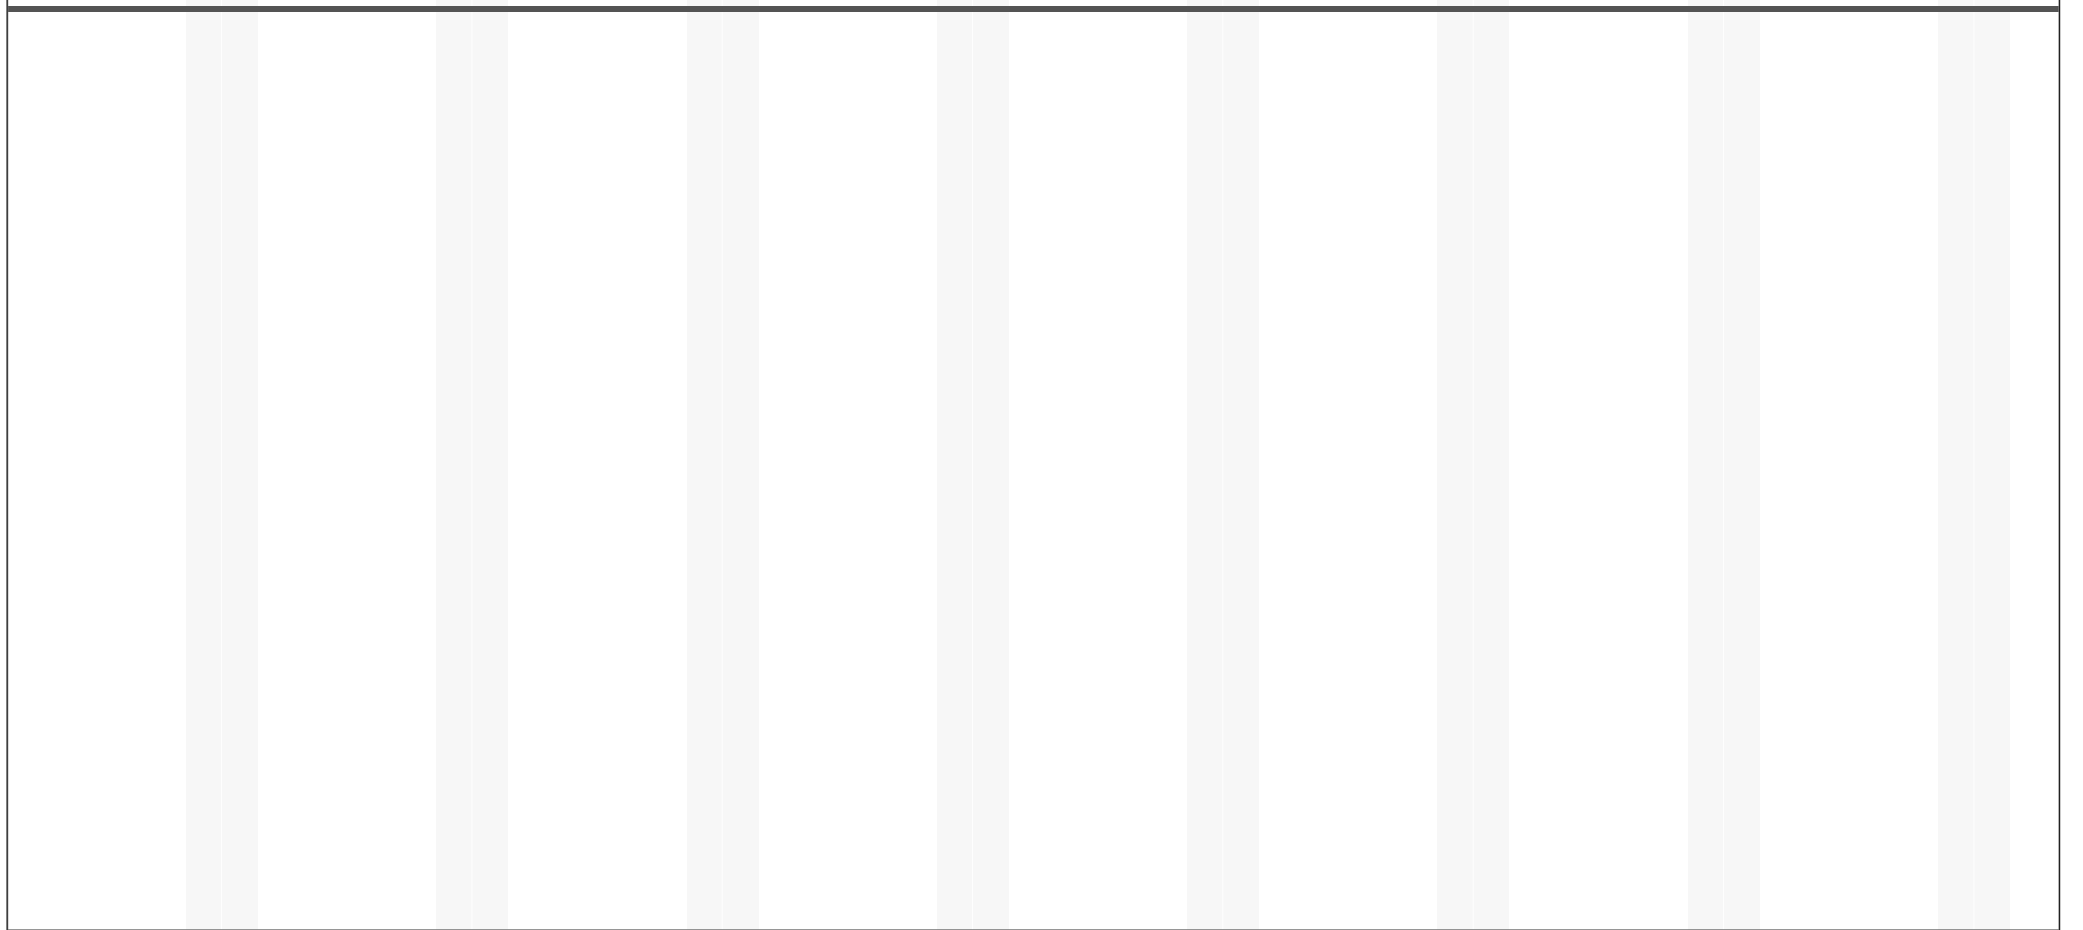

Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

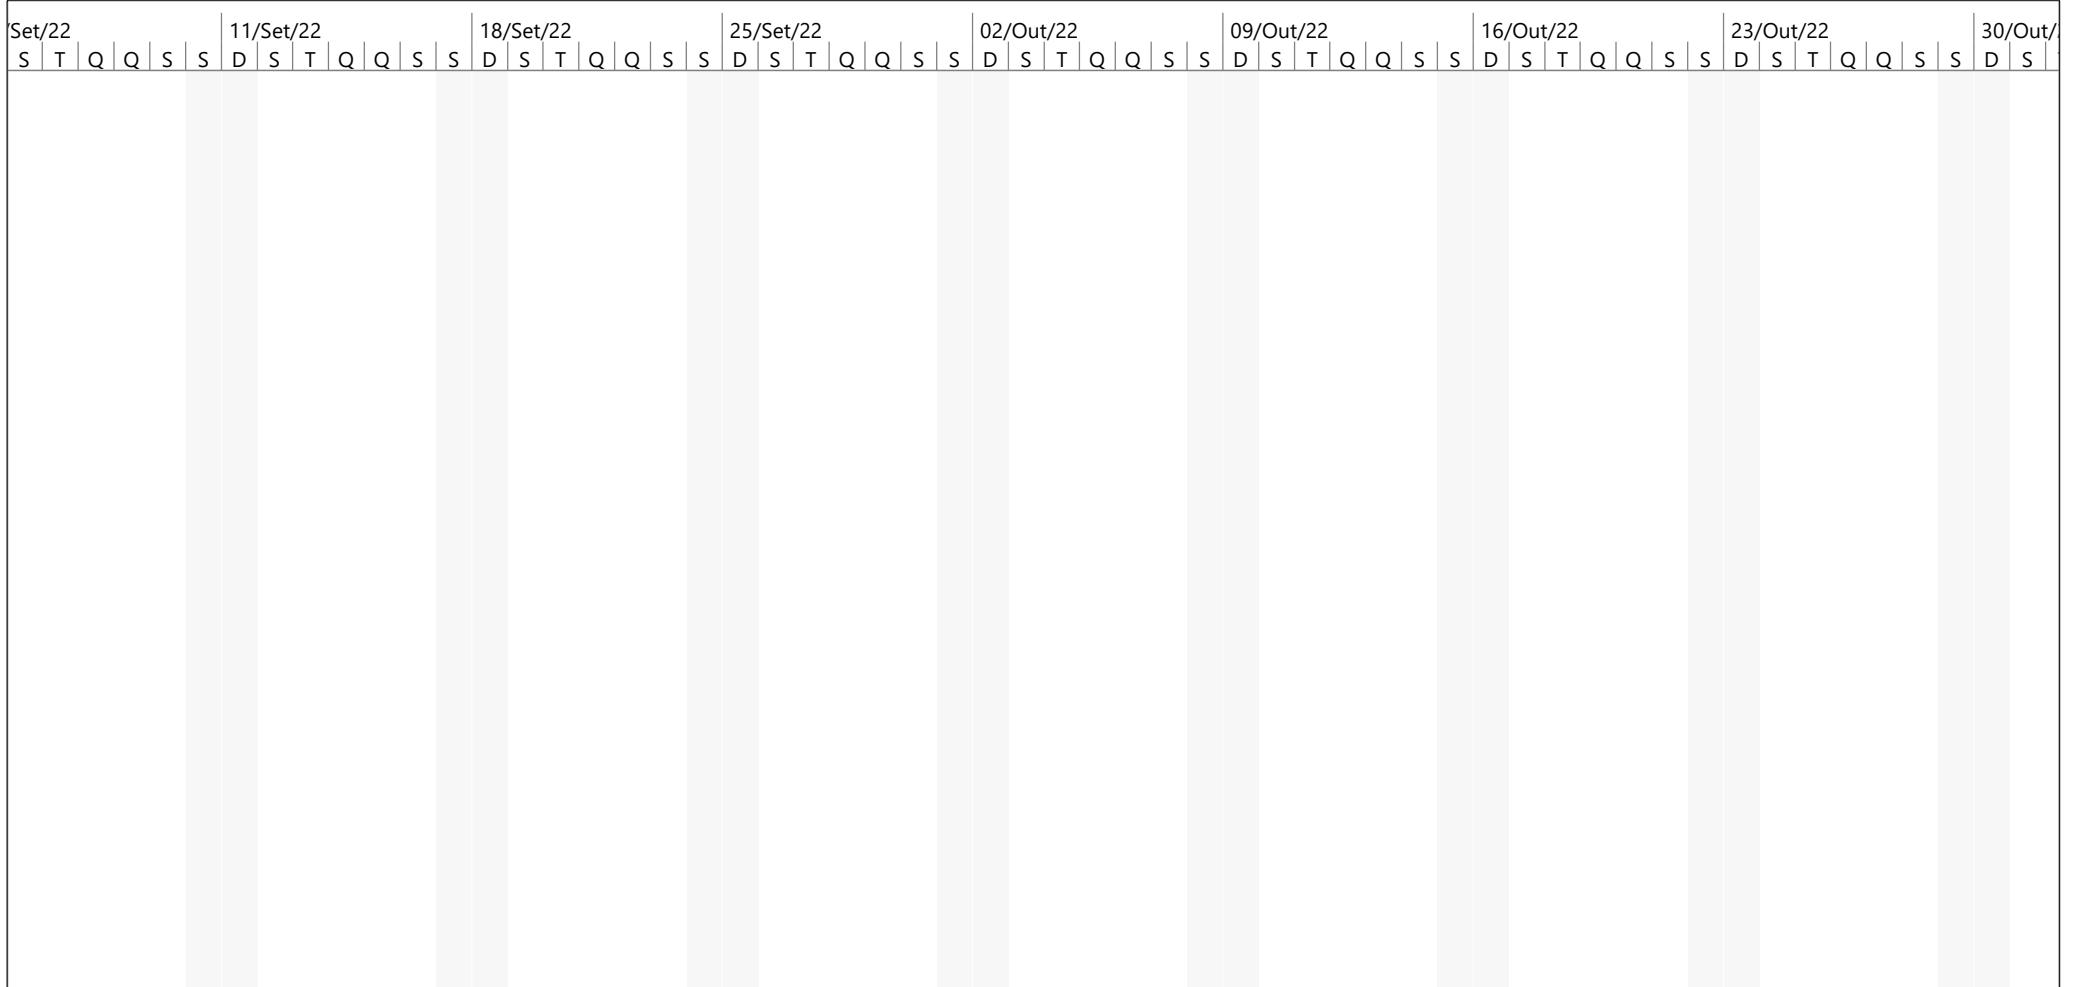


Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

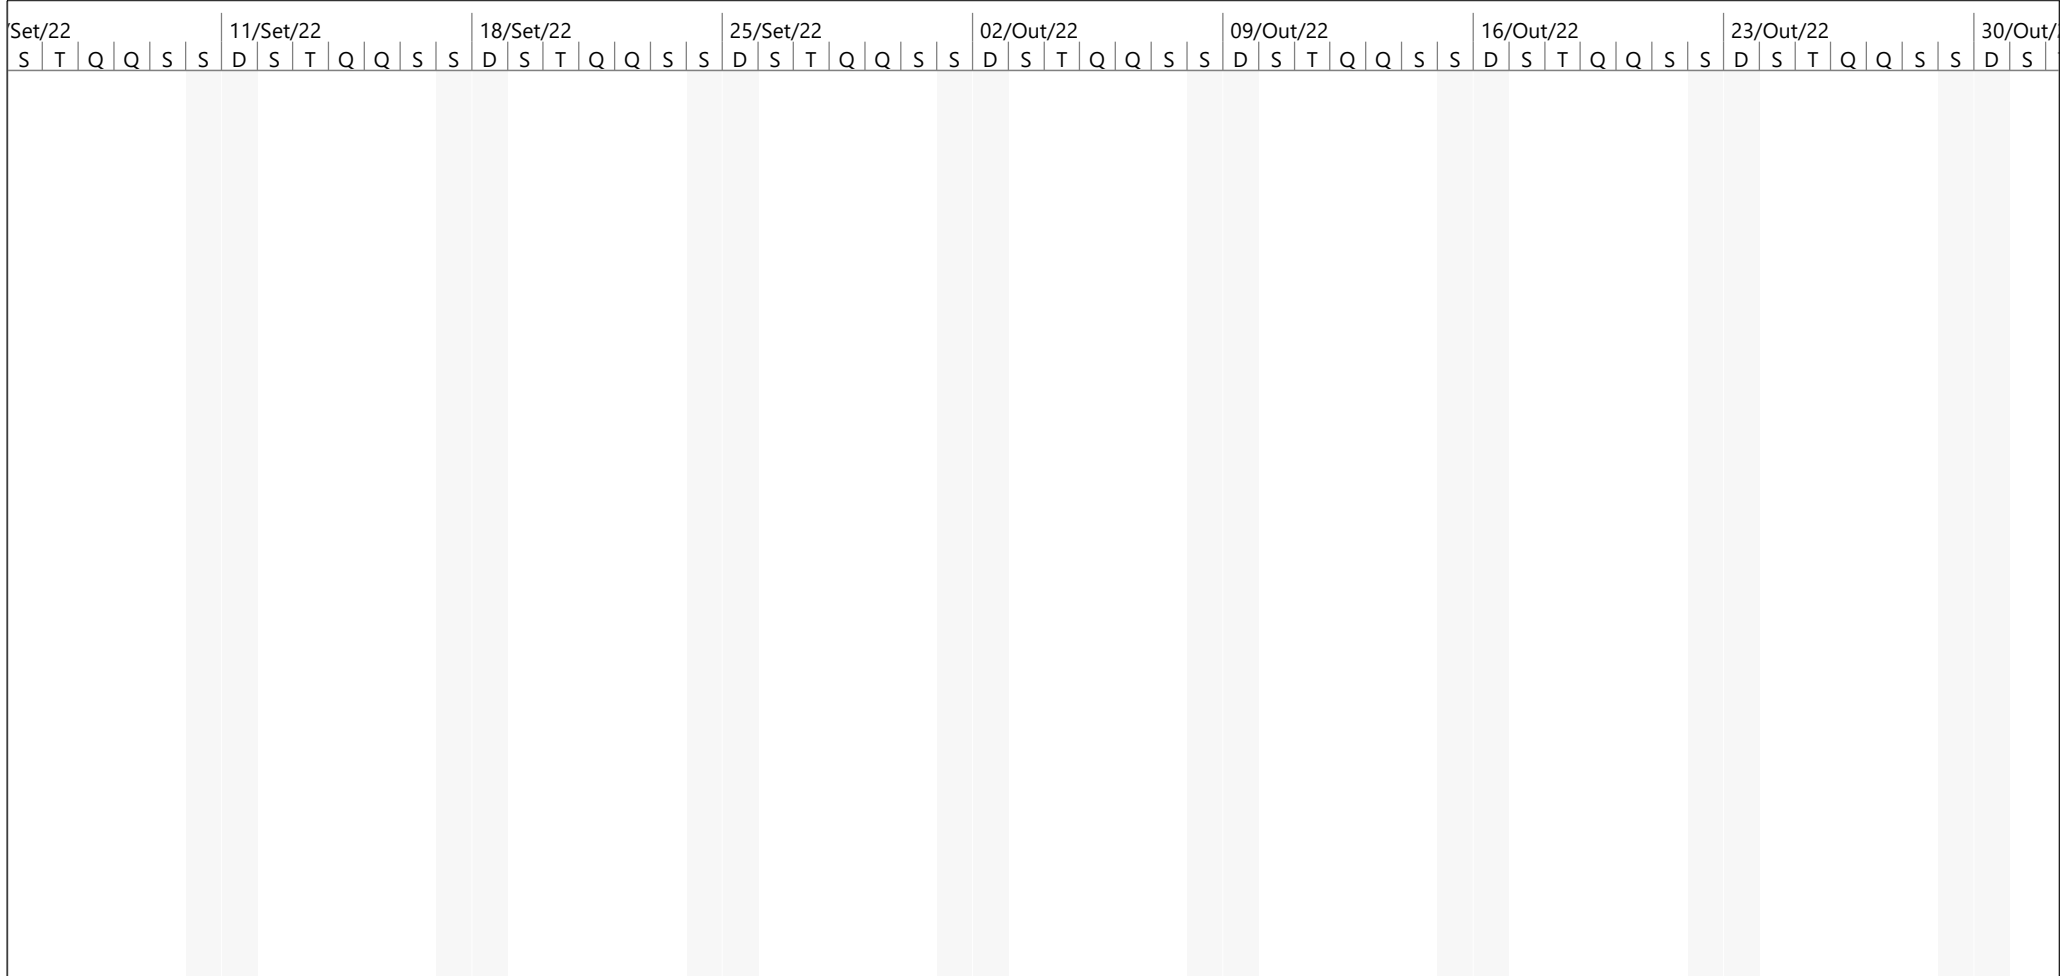

Projeto: Cronograma-Theoprax
 Data: Seg 23/05/22


Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Set/22 | 11/Set/22 | 18/Set/22 | 25/Set/22 | 02/Out/22 | 09/Out/22 | 16/Out/22 | 23/Out/22 | 30/Out/

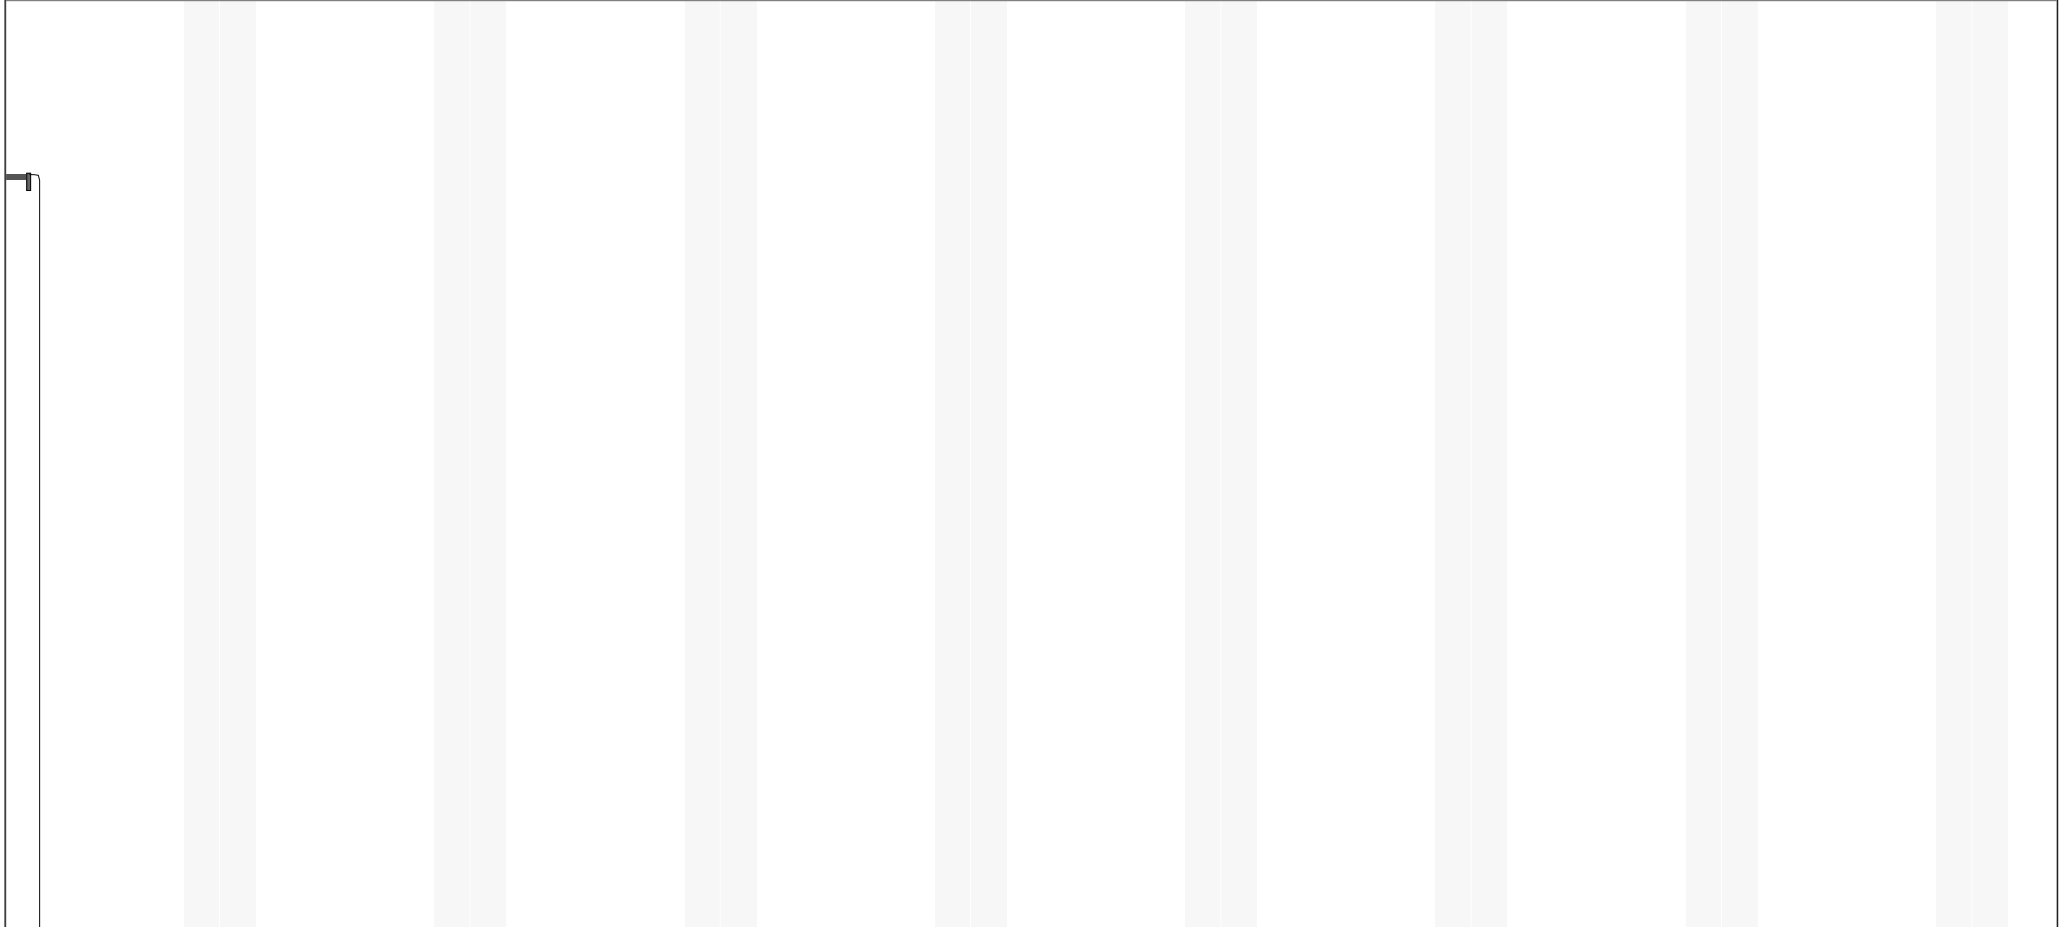


Projeto: Cronograma-Theoprax
 Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

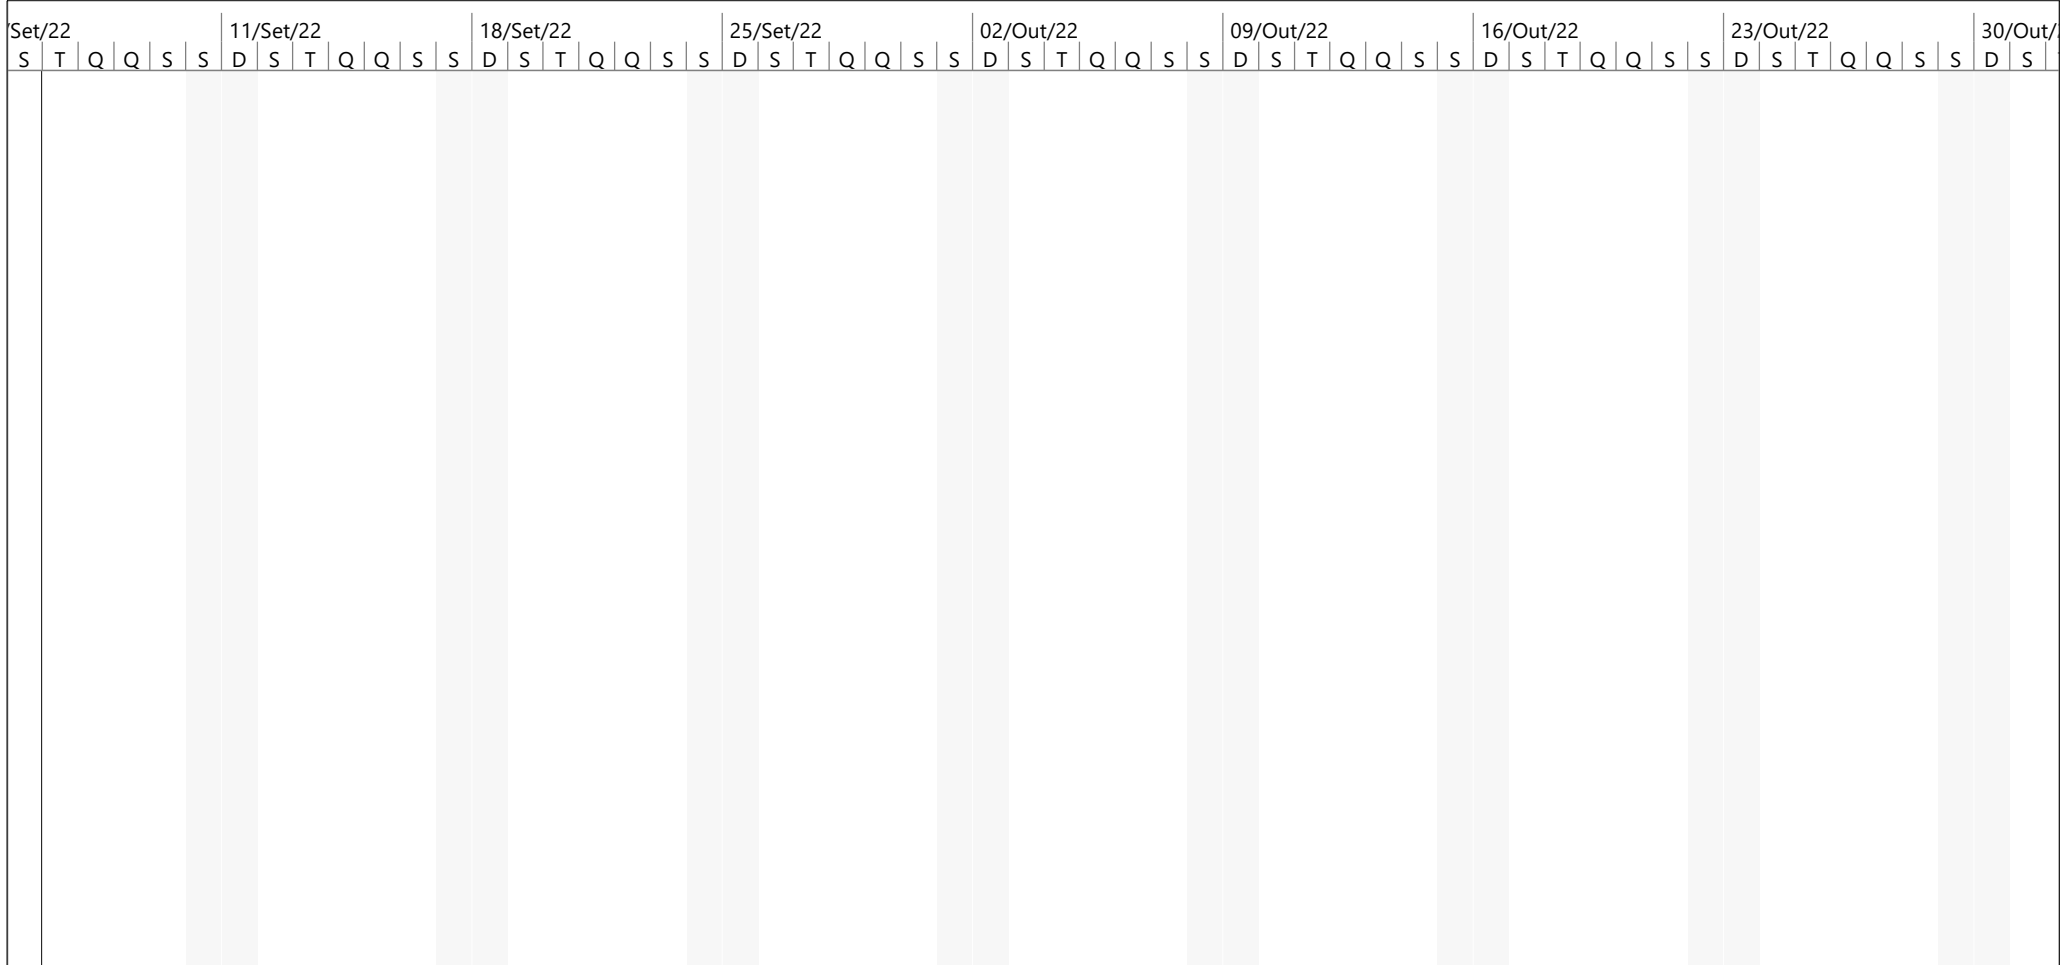


Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

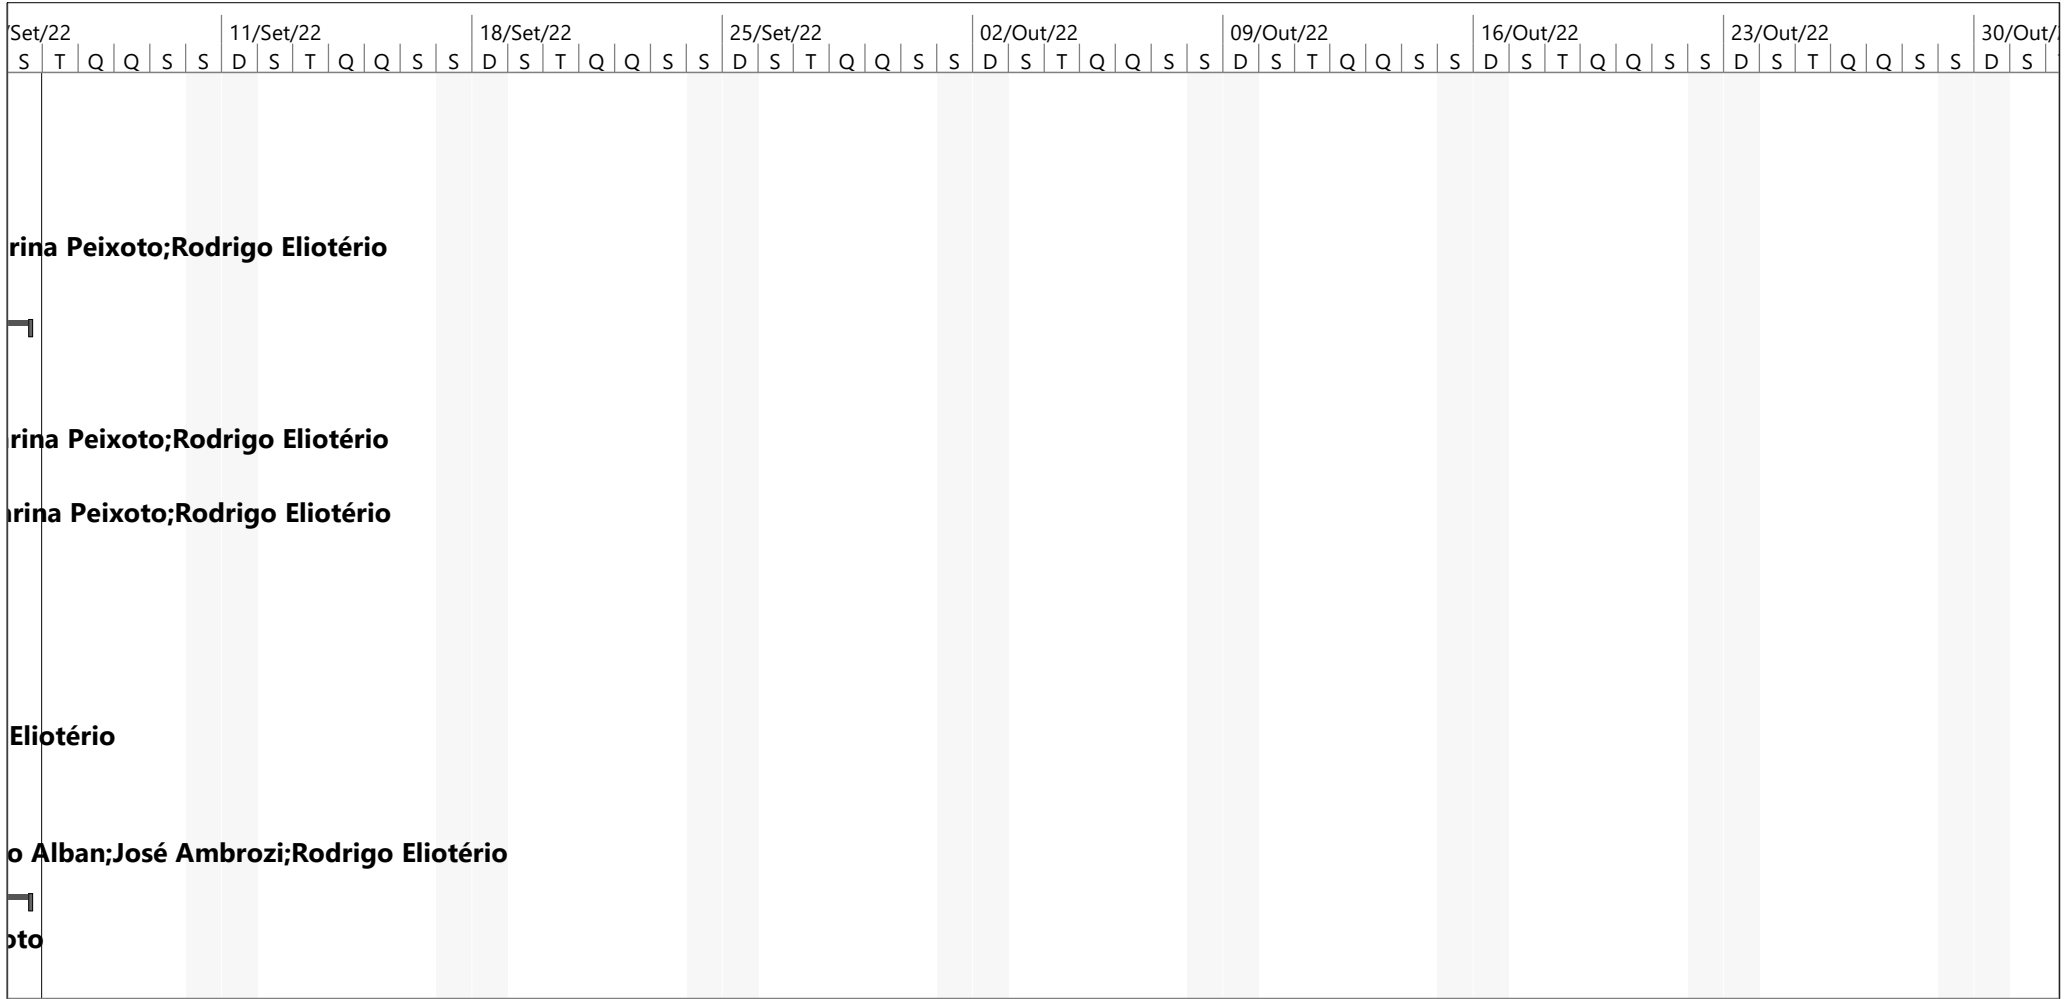



Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Set/22 11/Set/22 18/Set/22 25/Set/22 02/Out/22 09/Out/22 16/Out/22 23/Out/22 30/Out/22

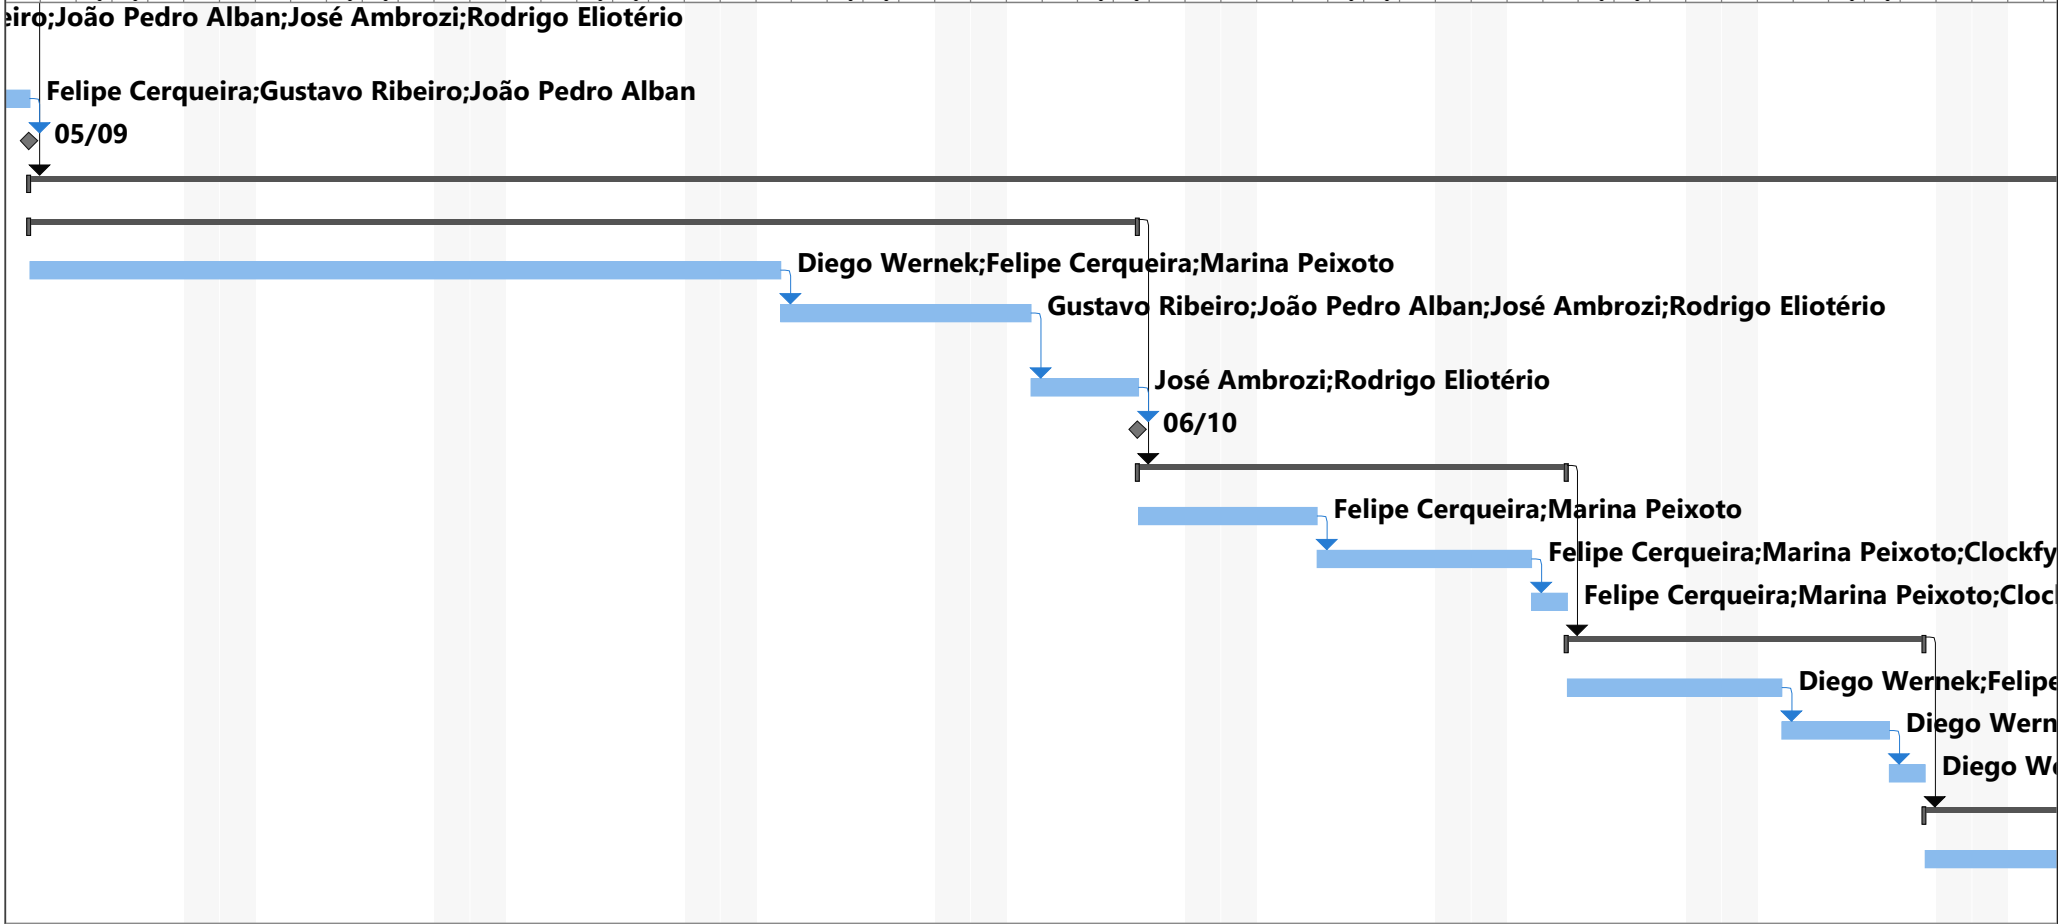


Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

Set/22 | 11/Set/22 | 18/Set/22 | 25/Set/22 | 02/Out/22 | 09/Out/22 | 16/Out/22 | 23/Out/22 | 30/Out/22
 S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

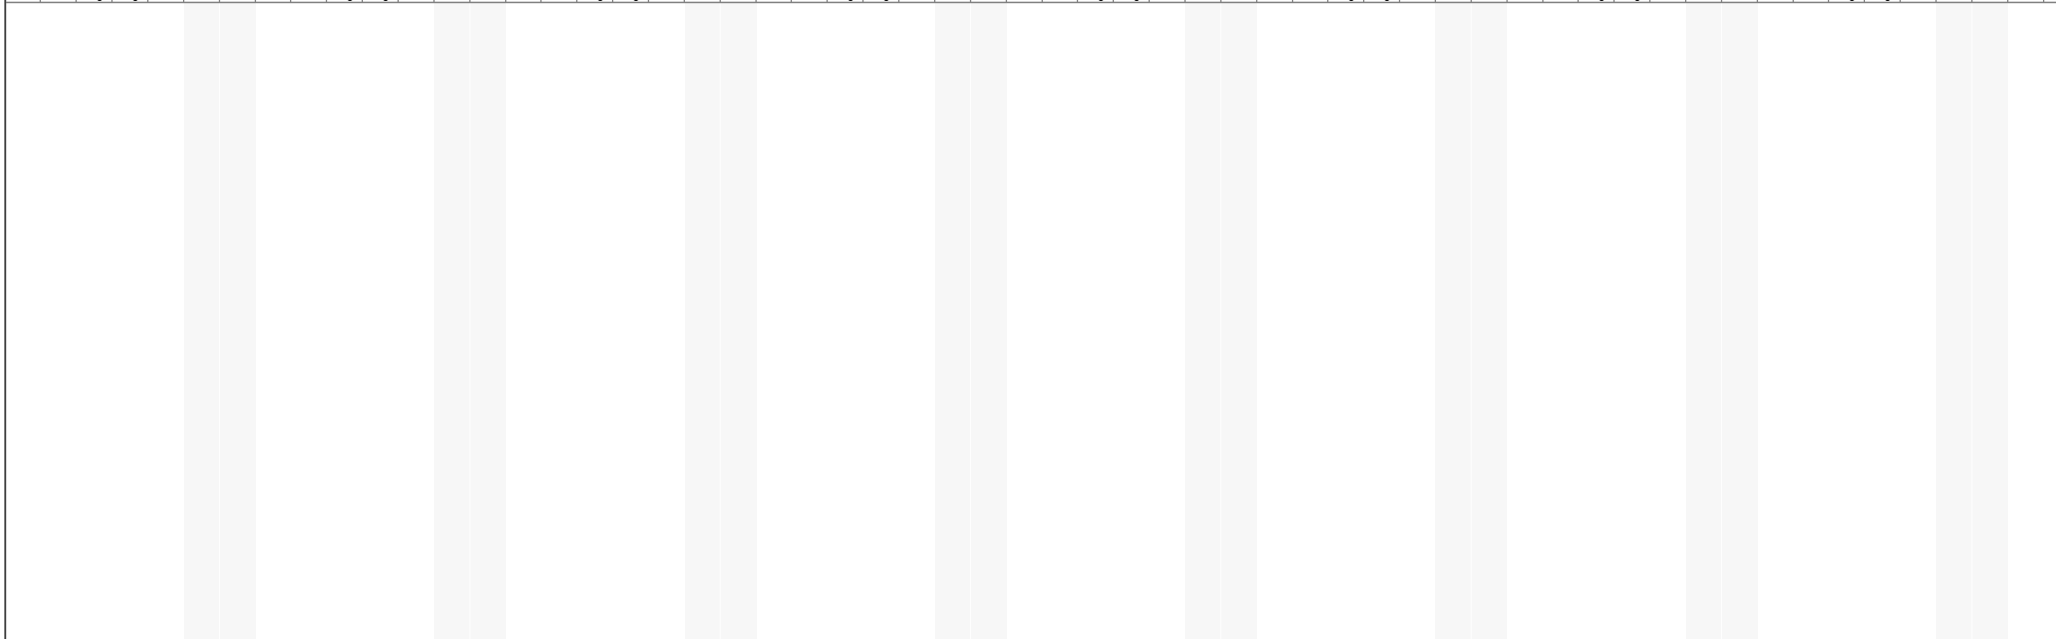


Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

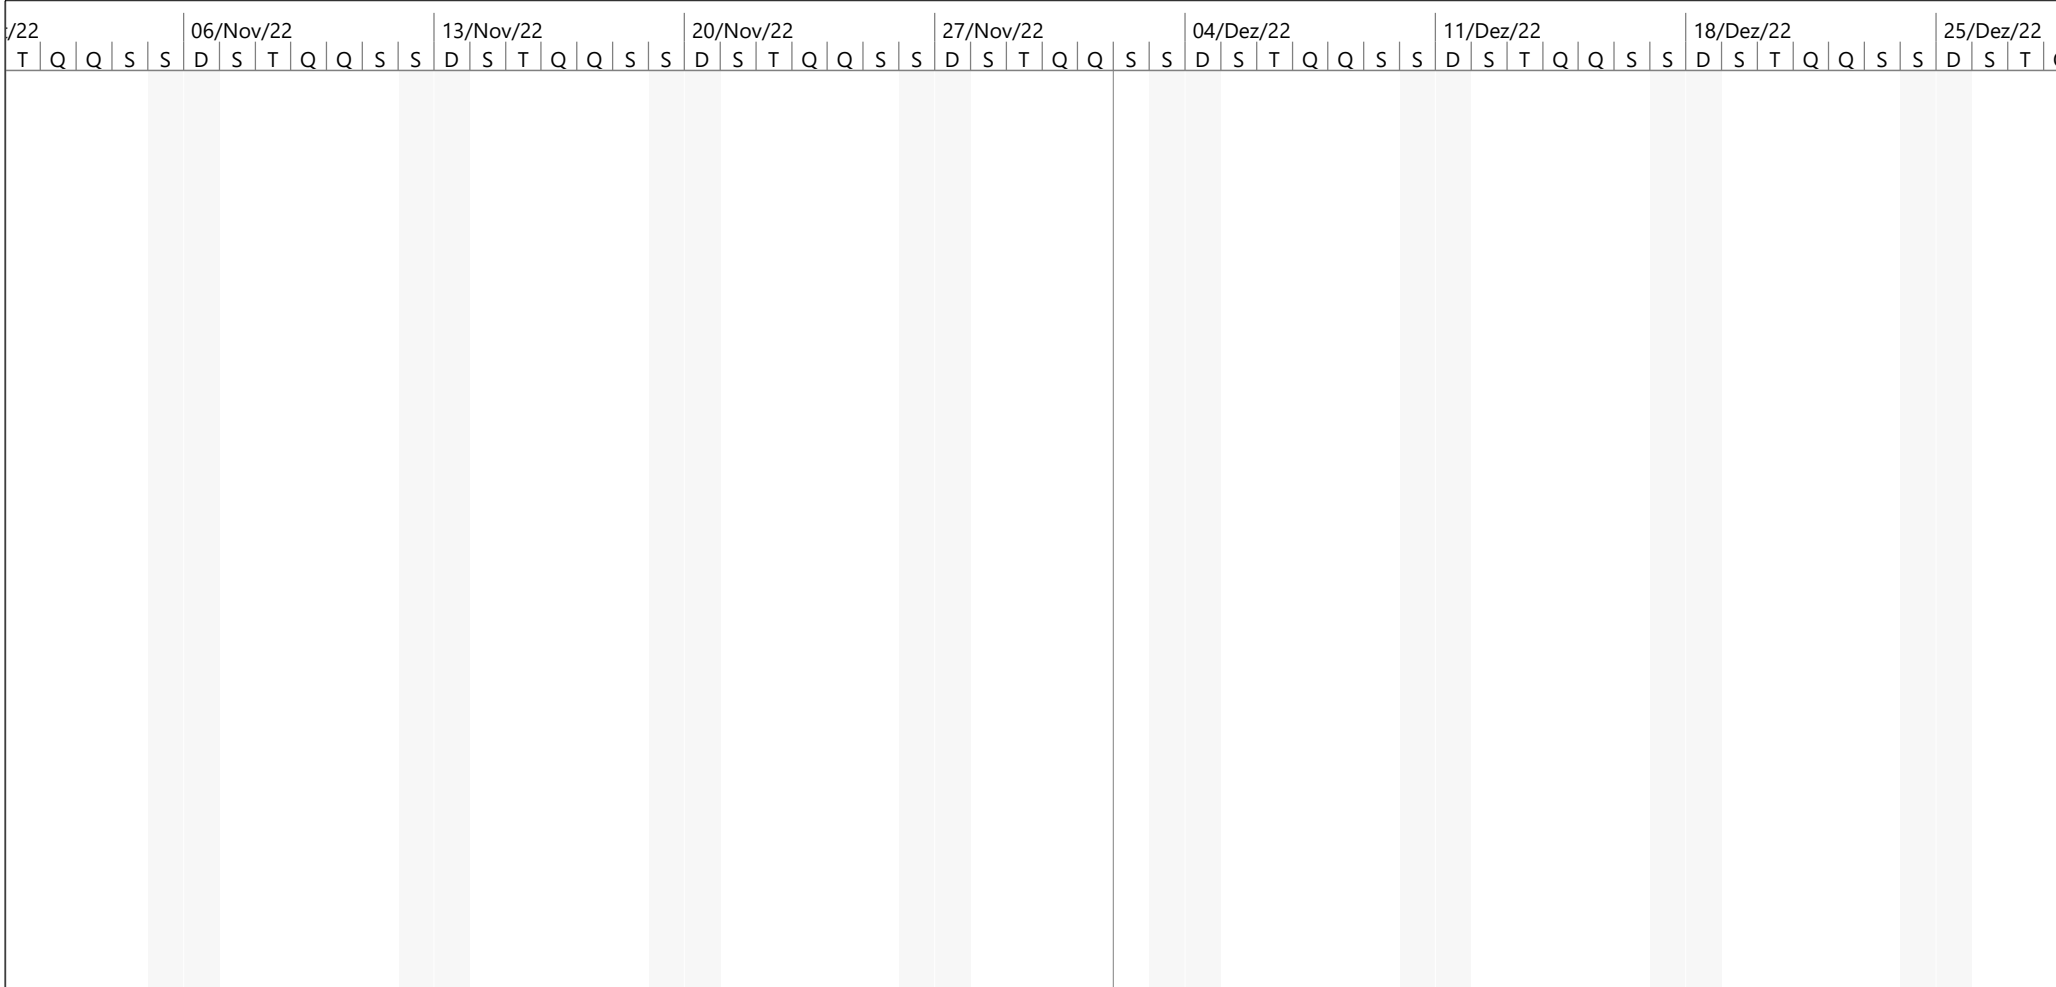


Projeto: Cronograma-Theoprax
 Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

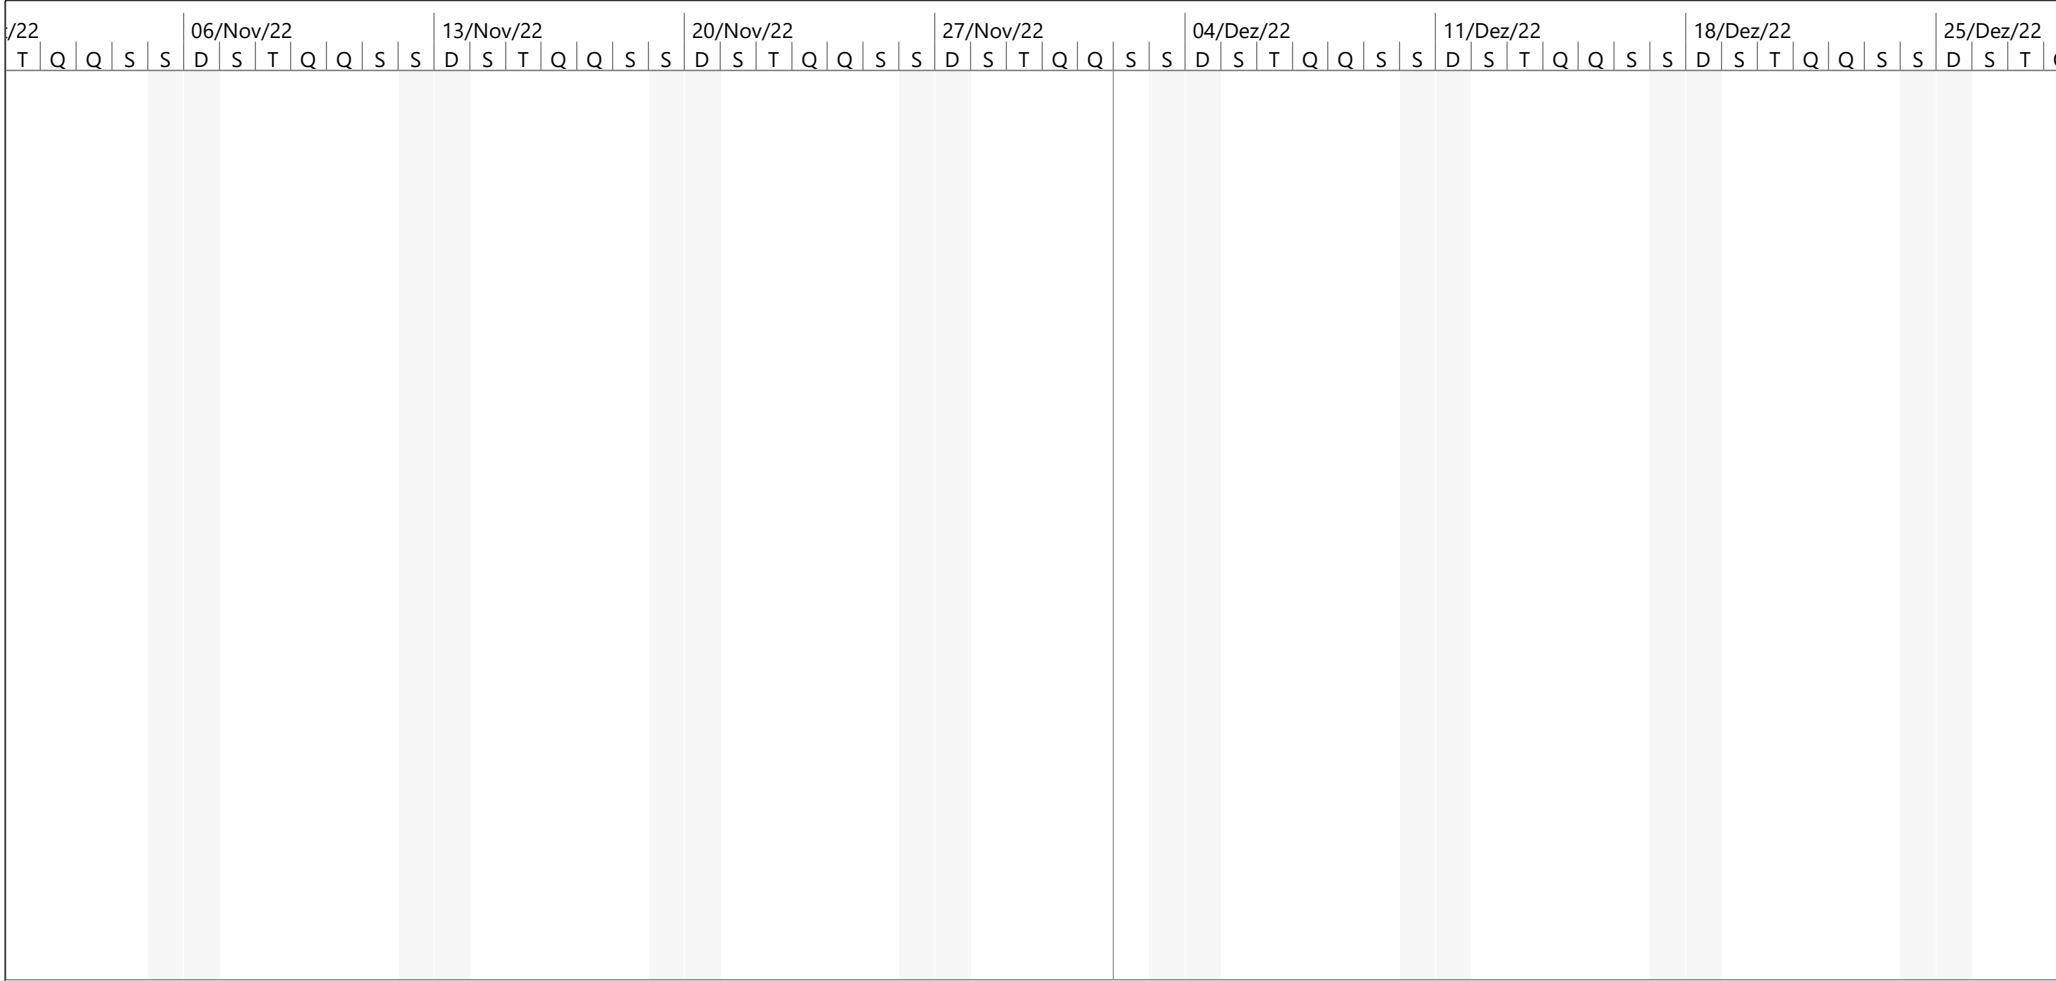


Projeto: Cronograma-Theoprax
 Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

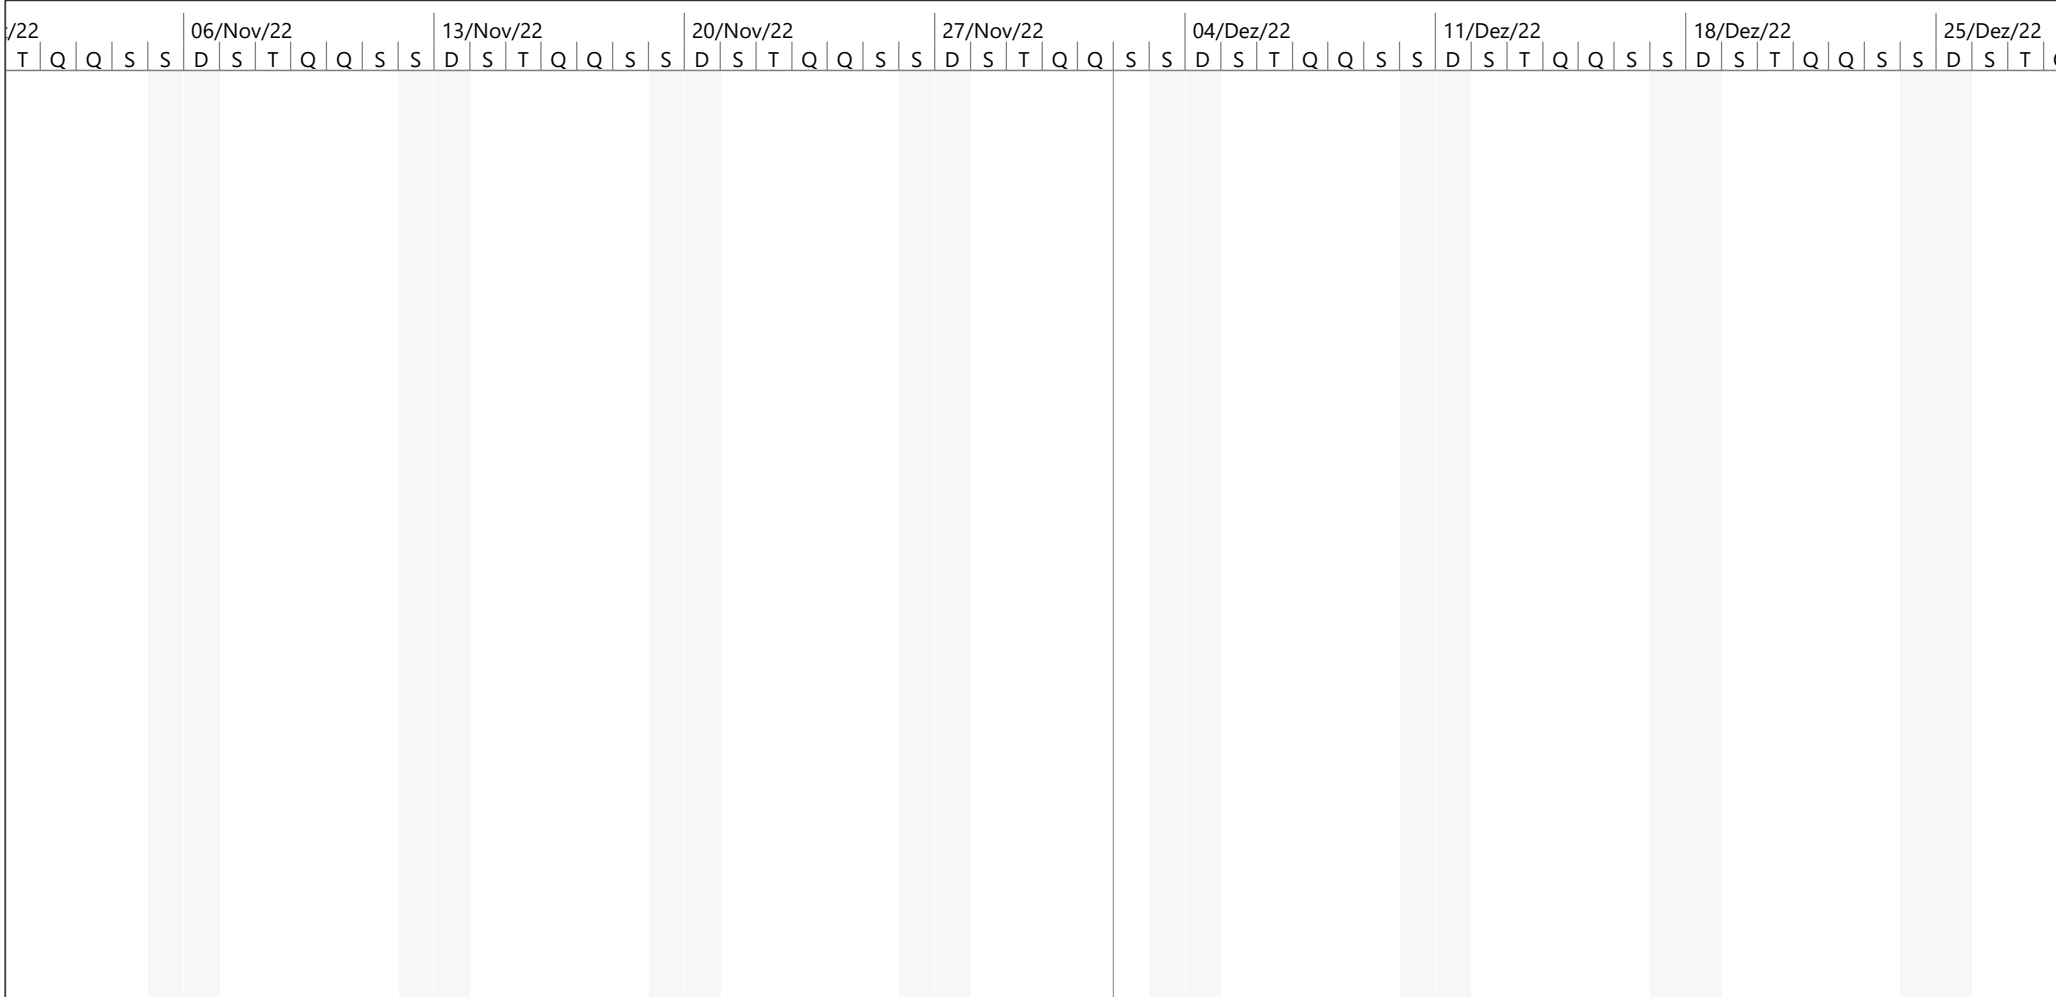


Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

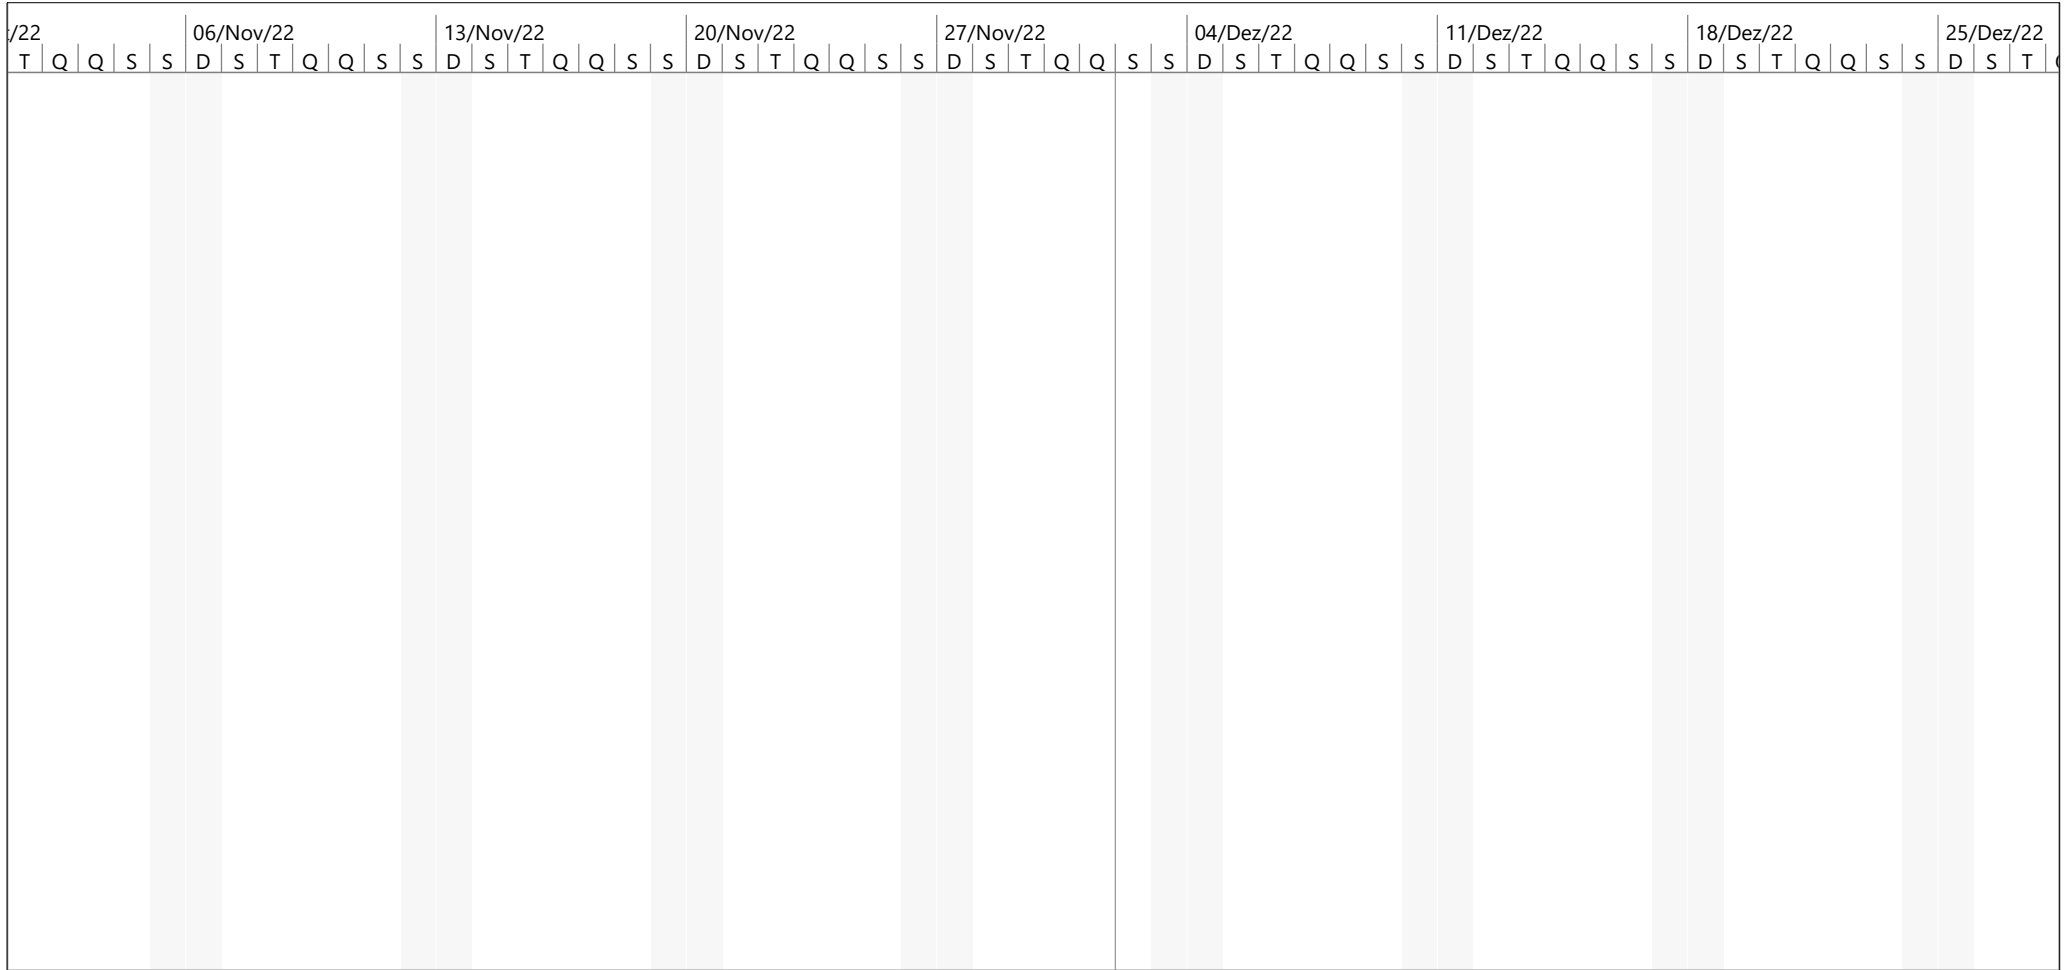


Projeto: Cronograma-Theoprax
 Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

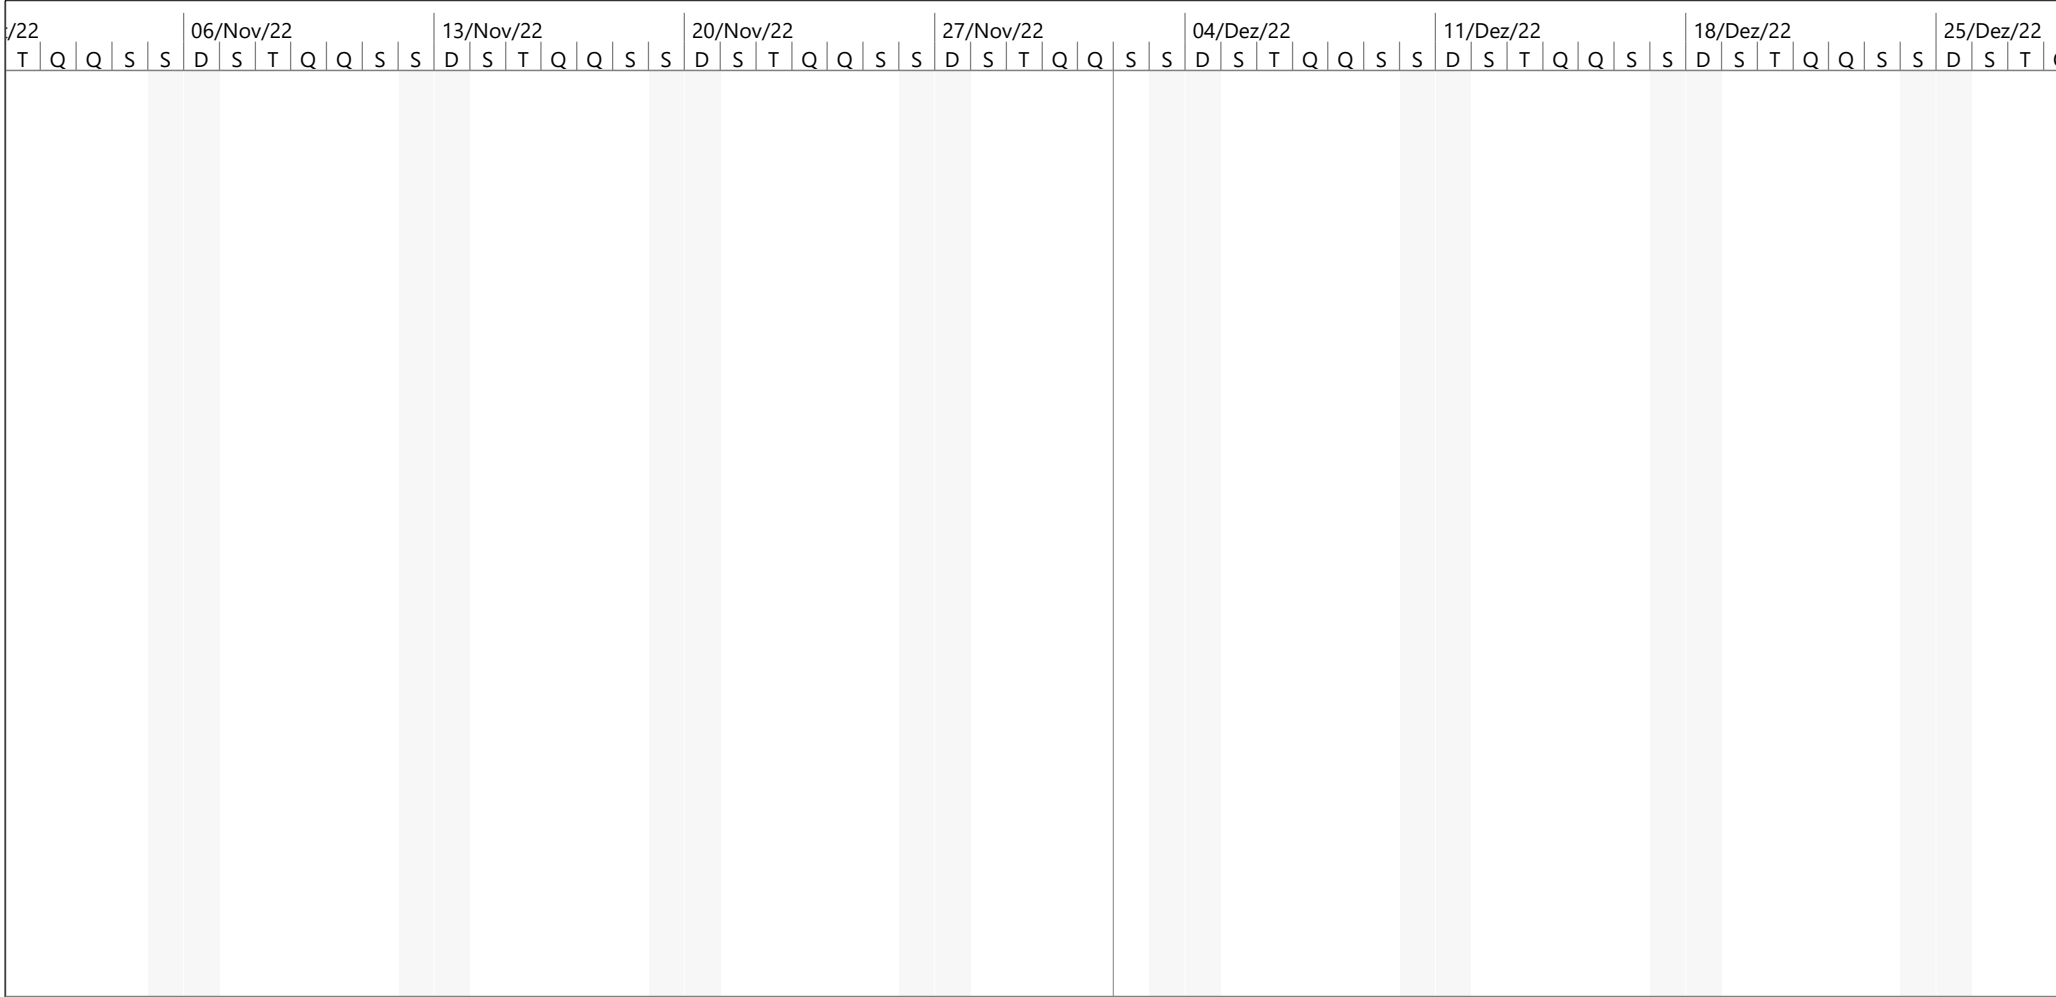

Projeto: Cronograma-Theoprax
 Data: Seg 23/05/22

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

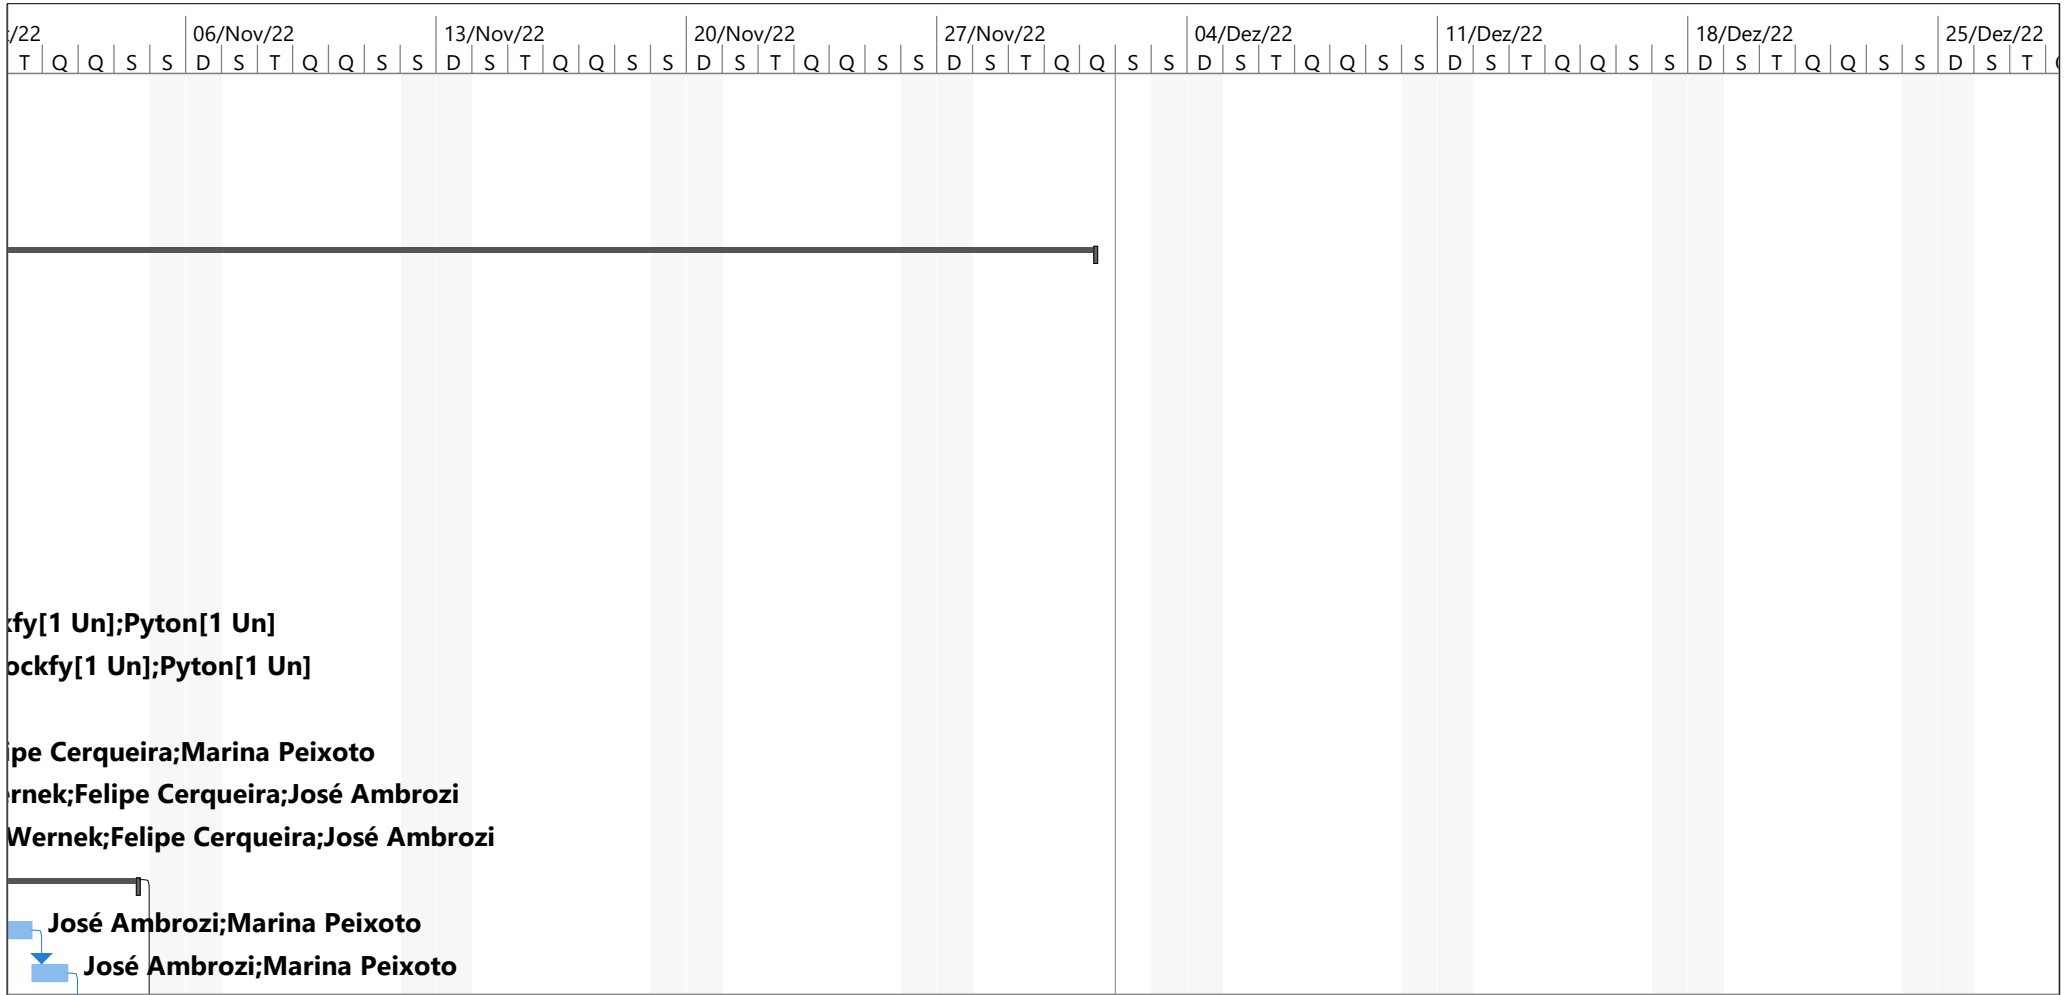

Projeto: Cronograma-Theoprax Data: Seg 23/05/22	Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
	Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
	Marco		Somente duração		Data limite	
	Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
	Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
	Tarefa Inativa		Somente início			
	Marco Inativo		Somente término			

